

※個別補助事業（道路メンテナンス事業）を申請する際に必要となる計画です。

阿波市橋梁長寿命化修繕計画

●第2案内橋（吉野町） 昭和54年建設



●高尾橋（土成町） 昭和41年建設



●芝生谷大橋（阿波町） 昭和57年建設



●金清橋（市場町） 昭和52年建設



令和2年3月
（令和4年部分改定）
阿波市建設部建設課

阿波市の橋の現状

阿波市では、令和元年度時点で橋の長さが2m以上の橋を632橋管理しています。これらの橋の多くは、高度経済成長期に建設されており、今後、急速に橋の高齢化が進むことが予想されます。

図-1は、阿波市が管理する632橋のうち、建設から50年以上が経過した橋の割合の推移を示しています。この図からは、建設から50年以上が経過した橋が令和元年時点で94橋（15%）であるのに対して、15年後には374橋（59%）、30年後には576橋（91%）となり、橋の高齢化が一段と進行することが分かります。



図-1 建設から50年以上が経過した橋の割合の推移

こうしたことから、高齢化した橋の安全性や信頼性を確保するためには、橋の修繕・架替えにかかる費用の増大が見込まれます。

このため、今後の橋の維持管理には、橋を出来るだけ長持ちさせ、合理的で効率的な維持管理を行うことによって、可能な限りコスト縮減に取り組むことが不可欠です。

従来の一般的な橋の寿命は50年～60年と言われていたけど、これからは、こまめに橋を治すことで、出来る限り橋を長持ちさせるよ。





阿波市の取組みと経緯

阿波市では、これまで橋の損傷が大きくなってから修繕を行ってきました。これからは損傷が小さいうちに修繕を行い、修繕や架替えに要する費用の縮減に努めつつ、地域の交通ネットワークの安全性・信頼性を確保していきます。

そのため阿波市では「橋梁長寿命化修繕計画」の策定により、これまでの『**対症的な維持管理**』から、橋の劣化の進行を予測し、損傷が大きくなる前に早めに手当てをする『**予防保全的な維持管理**』へ移行し、将来にわたる維持管理・更新(架替え)コストの最小化を目指していきます。

表-1 管理手法

維持管理手法		
種類	内容	費用
対症的な (従来の方法)	<ul style="list-style-type: none">大きな損傷になってから対策を実施損傷によるダメージが大きいため、橋を長く使うことが難しい	多 
予防保全的な (今後の方法)	<ul style="list-style-type: none">小さな損傷のうちに対策を実施損傷によるダメージが小さいため、橋を長く使うことができる	少 

阿波市では、重要な橋に対して平成 22 年 3 月に「橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、計画に基づいた修繕を行い、橋の長寿命化に取り組んできました。

平成 26 年には、道路法施行規則において、全ての橋を対象に 5 年に 1 回の目視による点検が義務化され、阿波市においても橋長 2m 以上の全ての橋に対し、目視による点検を行ってきました。

そして、前回の「橋梁長寿命化修繕計画」から 9 年経過し、すべての橋の点検が完了したことから、「橋梁長寿命化修繕計画」の見直しを行いました。

令和元年度の「橋梁長寿命化修繕計画」では、阿波市が管理する橋長 2m 以上の全ての橋を対象に計画の策定を行い、計画的に修繕などの対策を実施していきます。また、継続的に点検を実施し、計画の見直しを行います。

● 橋梁点検（橋の状態確認）




橋梁点検車による近接目視
高速道路の修繕工事(夜間通行止め)に
合わせて実施



梯子による近接目視

● メンテナンスサイクルの構築

定期点検で健全度を診断するとともに将来にわたる長寿命化修繕計画を策定し、予防的な修繕を行うことで橋の維持管理を効率的かつ効果的に進め、橋の長寿命化を目指します。

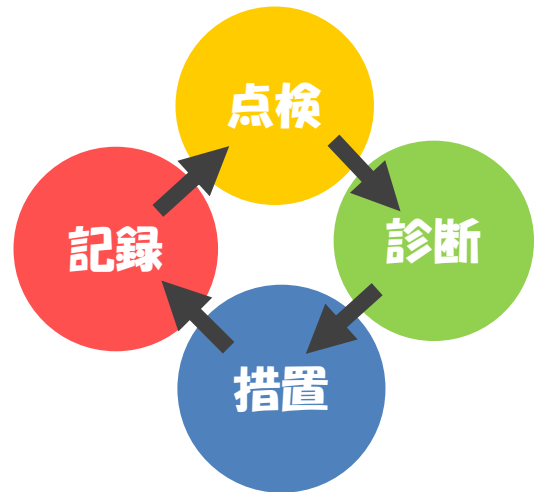


橋梁長寿命化修繕計画の見直し

● 対象橋梁、計画期間

阿波市が管理している2m以上の632橋を対象に、今後30年間の橋梁長寿命化修繕計画を見直し、計画的な維持管理を行うための対策の優先順位を決めました。

● 対策の優先順位の考え方

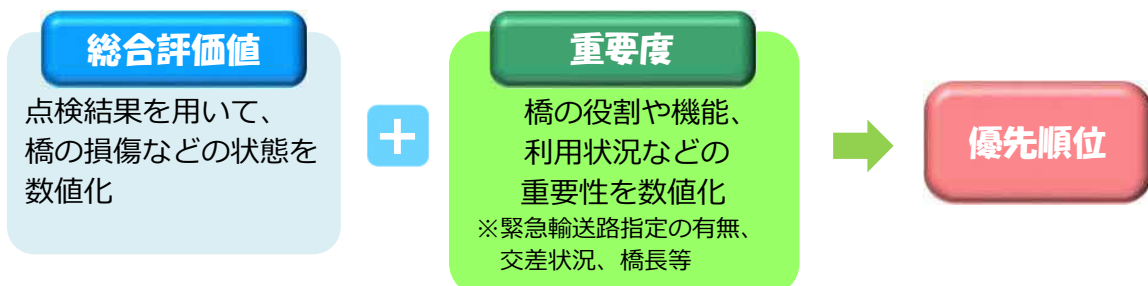

対策内容と実施時期

定期点検の結果、阿波市が管理する橋には、早めに修繕対策を行うことが望まれる橋が確認されました。「橋梁長寿命化修繕計画」では、橋の傷み具合や道路ネットワークに対する重要性などから優先順位を決定し、すでに計画済みの橋を含め、これらの橋の修繕を優先的に行う計画としています。

表-2 最初5年間の修繕計画

橋の名前	対策内容	実施時期				
		2020	2021	2022	2023	2024
馬場コモウ川1号橋	塗替塗装工					
向ヶ島コモウ川1号橋	塗替塗装工					
東久保1号橋	塗替塗装工					
千代橋	断面修復工ほか					
西ノ宮2号橋	塗替塗装工、断面修復工ほか					
山王子橋	断面修復工ほか					
上畑(太鼓坂)橋	塗替塗装工					
中大久保谷橋	断面修復工ほか					
伊沢谷橋	断面修復工ほか					
中坪橋	塗替塗装工					
橋嶽橋	断面修復工ほか					
芝生谷大橋	断面修復工ほか					
土柱大橋	断面修復工ほか					
伊沢谷川橋	塗替塗装工、断面修復工ほか					
広間橋	塗替塗装工、断面修復工ほか					
五明橋	断面修復工ほか					
長峰大橋	断面修復工ほか					
中央芝生谷橋	断面修復工ほか					
別埜池井出口2号橋	断面修復工ほか					
池田橋	断面修復工ほか					
六反田橋	断面修復工ほか					
金清橋	塗替塗装工、断面修復工ほか					
金清池橋	塗替塗装工、断面修復工ほか					
遅越下橋	断面修復工ほか					
遅越橋	断面修復工ほか					
大月橋	断面修復工ほか					
町境橋	断面修復工ほか					
東天神2号橋	断面修復工ほか					
小竹橋	断面修復工ほか					
国行5号橋	塗替塗装工					
632橋	定期点検	橋梁ごとに5年毎に実施				

2020~2024年に
順次実施

※補修工事は、橋のひび割れなどの対策や材料の腐食に対して塗装などを行います。

上記の計画は、今後の点検結果、財政状況によって変更となる可能性があります。

対策費用

本計画による試算では、今後 30 年間で橋の維持修繕に係る対策総事業費は、定期点検費・設計委託費・対策工事費を含め、現時点で、約 33.3 億円となりました。

検討会の開催

本計画は、「阿波市橋梁長寿命化修繕計画策定検討会」において、学識経験者の方から意見を頂いて作成しました。

● 意見を頂いた学識経験者

独立行政法人国立高等専門学校機構
阿南工業高等専門学校 創造技術工学科建設コース
笹田修司教授

● 検討会開催の様子

令和 2 年 3 月 3 日 開催



令和 2 年 3 月 10 日 開催



● 計画策定担当部署

771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田 201 番地 1
阿波市 建設部 建設課（阿波市役所 2 階）
TEL (0883) 36-8730 FAX (0883) 36-8763

今後の取り組み

● 新技術等の活用による維持管理の更なる高度化・効率化

橋梁長寿命化修繕計画に基づいた定期点検や修繕等の実施に当たっては、新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログ（案）などを参考に、従来工法のみではなく新工法や新材料などの新技術、ならびに、AI/IoT等のデジタル技術等を加えた比較検討を実施し、事業の効率化やコスト縮減を図ります。



図-2 新技術等の活用事例

● 橋梁（横断歩道橋を含む）の集約化・撤去等を含めた費用の縮減

今後の老朽化対策においては、厳しい財政状況や技術者不足といった制約の中で進めていくことになります。このため、定期点検では作業の効率化を目的として、新技術等の活用を重点的に検討することでコスト縮減を目指します。また、修繕工事ではすべての橋で設計段階から新技術等の活用を含めた比較検討を実施し、コスト縮減効果のある有効な新技術については積極的に採用することで費用の縮減を図ります。

その他、老朽化等により現橋の継続利用が困難な場合には、今後も同等以上の機能が必要な橋について「架替」を行いますが、周辺環境の変化等により役割を終えている橋は「単純撤去」を実施することも考えられます。さらには、社会経済情勢や利用状況等を踏まえて「迂回路の機能を充実させる（撤去＋迂回路整備）」、「機能を低下させる（ダウンサイジング）」、「架替橋梁を集約する（複数橋梁の集約）」等も選択肢に含め、今後は橋の集約化・撤去等による総合的な維持管理費の縮減についても検討を行います。

事業計画一覧 (1/13)

整理番号	橋梁コード	橋梁名	路線名称	道路種別	架設年度	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	橋面積(m ²)	委託費(千円)	径間数	橋種	考慮すべき事項			点検年度	健全性の診断	管理区分	修繕対策			点検実施時期
													路下条件	迂回路の有無	海岸からの距離(km)				対策内容	実施時期	概算事業費(千円)	
1	1001	案内橋	旭線	1級	1989	24.60	6.85	5.65	138.99	5,300	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年
2	1002	江崎橋(大牛線)	大牛線	その他	1980	14.50	3.90	3.00	43.50	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
3	1003	西二条熊谷4号橋	西二条3号線	その他	1996	16.50	5.20	4.00	66.00	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
4	1004	大牛橋	大牛小笠前北線	その他	1980	19.60	6.50	5.50	107.80	5,300	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年
5	1005	折口2号橋	中西東線	その他	1990	14.10	5.20	4.00	56.40	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
6	1006	大谷川橋	シノ原町境線	その他	2003	24.50	5.70	4.50	110.25	5,300	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
7	1007	第2案内橋	西二条8号線	その他	1979	28.40	4.80	4.00	113.60	5,300	2	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
8	1008	西二条熊谷1号橋	二条旭線	その他	1984	17.10	3.80	3.00	51.30	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
9	1009	西二条熊谷3号橋	西二条シノ原線	その他	1987	14.90	6.20	5.00	74.50	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	---	---	0	2025年
10	1010	西二条熊谷2号橋	西二条4号線	その他	1987	15.10	5.60	4.40	66.44	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
11	1011	大柳橋	折口線	その他	1991	15.70	6.50	5.30	83.21	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2029年	4,709	2025年
12	1012	田中北部2号橋	岡ノ川原北原線	1級	1974	12.45	10.89	10.07	125.37	5,300	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
13	1013	姥御前橋	鳴池1号線	その他	1954	10.00	5.10	4.50	45.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2033年	346	2025年
14	1015	大野神大正2号橋	岡ノ川原野田原線	1級	1984	2.90	5.30	5.00	14.50	4,400	1	RC橋	開水路	有り	13.19	2018年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2036年	2,678	2023年
15	1017	どうどう川1号橋	岡ノ川原北原線	1級	1977	2.94	6.44	6.00	17.64	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	555	2026年
16	1019	出口大正1号橋	出口野田原線	その他	1956	2.30	3.45	3.15	7.25	4,400	1	RC橋	開水路	有り	13.22	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
17	1024	小笠前2号橋	小笠小島線	2級	1984	2.00	8.00	7.50	15.00	4,400	1	RC橋	開水路	有り	14.26	2018年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2032年	848	2023年
18	1025	どうどう川9号橋	原市ムトウ線	2級	1995	2.85	7.60	7.10	20.24	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
19	1026	馬場コモウ川1号橋	楠ノ本本郷線	2級	1969	8.50	5.90	5.50	46.75	4,400	1	鋼橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	塗替塗装工	2024年	3,145	2026年
20	1027	江崎橋(江崎線)	江崎線	2級	1984	13.80	3.80	3.00	41.40	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	---	---	0	2025年
21	1028	北二条熊谷1号橋	南二条南北線	2級	2017	11.60	6.70	5.50	63.80	4,400	1	PC橋	河川	有り	14.37	2018年	II	管理区分2	---	---	0	2023年
22	1029	大牛大千田1号橋	大牛大千田線	2級	1997	3.50	9.90	8.70	30.45	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	---	---	0	2025年
23	1030	東須賀南部2号橋	イギス東須賀線	その他	1999	2.90	25.10	24.30	70.47	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	2,559	2022年
24	1031	東須賀南部1号橋	東須賀1号線	その他	1999	2.90	7.30	6.50	18.85	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	716	2022年
25	1032	宮前コモウ川2号橋	井ノ元本線	その他	1984	3.00	9.10	8.50	25.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
26	1033	北須賀南部6号橋	北須賀東線	その他	1984	2.80	7.50	4.00	11.20	4,400	1	BOX	開水路	有り	13.16	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	597	2023年
27	1034	北須賀南部5号橋	堀切北須賀線	その他	1966	2.78	7.40	7.00	19.46	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2033年	981	2022年
28	1035	町口北部1号橋	一条神社前線	その他	1975	2.34	14.90	13.90	32.53	4,400	1	BOX	開水路	無し	99	2017年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2030年	1,930	2022年
29	1036	宮前コモウ川1号橋	一条神社前線	その他	1975	3.40	5.87	5.55	18.87	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
30	1037	北須賀南部4号橋	一条神社前線	その他	1994	4.50	5.00	5.00	22.50	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
31	1040	町口幹線2号橋	町口2号線	その他	1968	3.50	28.50	27.70	96.95	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	4,426	2022年
32	1042	庄境コモウ川1号橋	庄境15号線	その他	1981	5.40	6.24	5.70	30.78	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
33	1043	庄境コモウ川2号橋	庄境15号線	その他	1981	4.45	5.47	5.17	23.01	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
34	1044	岡ノ元北部2号橋	一条小学校北線	その他	1999	3.24	2.30	2.30	7.45	4,400	1	BOX	開水路	有り	12.56	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	270	2023年
35	1045	立花橋	立花北線	その他	2000	2.40	4.90	4.90	11.76	4,400	1	RC橋	開水路	有り	12.38	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
36	1046	向ヶ島コモウ川1号橋	五条町境線	その他	1969	8.45	3.90	3.50	29.58	4,400	1	鋼橋	開水路	有り	99	2017年	III	管理区分3	塗替塗装工	2033年	2,319	2022年
37	1047	東久保1号橋	五条神社東線	その他	1969	8.45	3.90	3.50	29.58	4,400	1	鋼橋	開水路	有り	99	2017年	III	管理区分3	---	---	0	2022年
38	1048	コモウコモウ川4号橋	本郷田中線	その他	1969	8.45	3.92	3.52	29.74	4,400	1	鋼橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2033年	266	2022年
39	1049	向ヶ島1号橋	向ヶ島田中線	その他	2000	2.50	5.20	4.60	11.50	4,400	1	RC橋	開水路	有り	11.48	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
40	1050	コモウコモウ川3号橋	田中東線	その他	1995	9.05	6.20	5.00	45.25	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
41	1051	コモウコモウ川1号橋	田中東線	その他	1971	3.86	10.36	9.91	38.25	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
42	1052	コモウコモウ川2号橋	地免本郷線	その他	2002	5.90	6.30	5.50	32.45	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
43	1053	田中北部3号橋	西姥田中線	その他	1995	5.59	5.05	4.25	23.76	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
44	1054	田中北部4号橋	田中北線	その他	1999	5.50	5.55	5.00	27.50	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
45	1055	楠の本北部2号橋	楠ノ本本線	その他	1969	3.90	5.20	4.40	17.16	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	1,041	2022年
46	1056	楠の本北部1号橋	楠ノ本西線	その他	1995	3.90	5.92	5.20	20.28	4,400	1	BOX	開水路	有り	11.13	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	796	2023年
47	1057	市ノ本北部1号橋	市ノ本線	その他	1970	5.10	2.00	1.70	8.67	4,400	1	RC橋	開水路	有り	11.5	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2038年	68	2023年
48	1058	北原北部1号橋	北原南線	その他	1970	4.00	12.00	11.40	45.60	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	1,694	2022年
49	1060	北原北部2号橋	北原中央線	その他	1999	4.00	5.00	5.00	20.00	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
50	1061	岡ノ川原北部2号橋	町口岡ノ元線	その他	1999	3.24	7.80	7.80	25.27	4,400	1	BOX	開水路	有り	12.61	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	921	2023年

事業計画一覧(2/13)

整理番号	橋梁コード	橋梁名	路線名称	道路種別	架設年度	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	橋面積(m ²)	委託費(千円)	径間数	橋種	考慮すべき事項			点検年度	健全性の診断	管理区分	修繕対策			点検実施時期
													路下条件	迂回路の有無	海岸からの距離(km)				対策内容	実施時期	概算事業費(千円)	
51	1062	岡ノ元北部1号橋	岡ノ元1号線	その他	1999	3.24	3.00	3.00	9.72	4,400	1	BOX	開水路	有り	12.6	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	355	2023年
52	1063	岡ノ元北部3号橋	岡ノ元南線	その他	1999	3.24	10.00	9.50	30.78	4,400	1	BOX	開水路	有り	12.49	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
53	1064	岡ノ元1号橋	岡ノ元3号線	その他	1970	2.20	3.90	3.70	8.14	4,400	1	RC橋	開水路	有り	12.58	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
54	1065	田中北部1号橋	五条団地線	その他	1999	3.90	4.00	4.00	15.60	4,400	1	BOX	開水路	有り	12.03	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	706	2023年
55	1066	原田1号橋	五条団地線	その他	1970	6.40	4.20	4.00	25.60	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	I	管理区分3	---	---	0	2022年
56	1067	原田2号橋	五条団地線	その他	1984	2.00	27.00	27.00	54.00	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2023年	2,918	2026年
57	1068	原田3号橋	五条団地北線	その他	1984	2.20	6.00	5.80	12.76	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分2	---	---	0	2022年
58	1069	どうどう川2号橋	東姥岡ノ元線	その他	1973	5.00	5.00	4.70	23.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
59	1070	岡ノ元2号橋	東姥岡ノ元線	その他	1970	2.05	4.70	4.70	9.64	4,400	1	RC橋	開水路	有り	12.36	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
60	1071	岡ノ元北部4号橋	東姥岡ノ元線	その他	1984	3.32	5.75	4.75	15.77	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
61	1072	どうどう川3号橋	原市本線	その他	1984	3.93	5.50	4.50	17.69	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	1,023	2022年
62	1074	どうどう川5号橋	東姥西線	その他	1971	4.50	4.35	3.95	17.78	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
63	1075	どうどう川4号橋	東姥西線	その他	1970	4.50	4.80	4.40	19.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
64	1076	どうどう川6号橋	西姥線	その他	1970	4.75	4.40	4.00	19.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2047年	741	2022年
65	1077	どうどう川7号橋	姥御前橋北線	その他	2000	2.86	6.00	5.40	15.44	4,400	1	BOX	河川	有り	11.71	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	802	2023年
66	1079	折口3号橋(蛇池幹線2号橋)	折口線	その他	1999	2.40	5.55	4.55	10.92	4,400	1	RC橋	開水路	有り	13.56	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
67	1080	蛇池1号橋	大西亀田線	その他	1986	6.33	4.80	4.00	25.32	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
68	1081	大西亀田1号橋(蛇池幹線1号橋)	大西亀田線	その他	1985	5.10	4.90	4.10	20.91	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
69	1083	中小路江崎1号橋(中西幹線2号橋)	中小路江崎線	その他	1999	3.50	4.10	3.50	12.25	4,400	1	RC橋	開水路	有り	13.3	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	572	2023年
70	1084	大西1号橋	蛇池小笠前北線	その他	1984	2.80	5.60	5.40	15.12	4,400	1	RC橋	開水路	有り	13.83	2018年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2023年	867	2023年
71	1088	どうどう川8号橋	西姥2号線	その他	1995	4.17	4.80	4.00	16.68	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
72	1091	小笠前3号橋	蛇池小笠前南線	その他	1984	2.40	6.35	6.00	14.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2024年	786	2022年
73	1092	小笠前幹線4号橋	小笠前本線	その他	1964	6.80	5.40	4.60	31.28	4,400	1	PC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
74	1093	小笠前幹線2号橋	小笠前4号線	その他	1984	4.80	3.20	2.50	12.00	4,400	1	RC橋	開水路	有り	14.23	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
75	1094	小笠前幹線1号橋	大伊川線	その他	1964	5.80	4.80	4.00	23.20	4,400	1	PC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
76	1095	小笠前幹線5号橋	小笠前南支線	その他	1984	4.90	3.20	2.50	12.25	4,400	1	RC橋	開水路	有り	14.08	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2038年	624	2023年
77	1096	小笠前幹線6号橋	小笠前南支線	その他	1984	4.90	3.20	2.50	12.25	4,400	1	RC橋	開水路	有り	13.97	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
78	1097	小笠前幹線3号橋	小笠前南線	その他	1984	4.70	3.20	2.50	11.75	4,400	1	RC橋	開水路	有り	14.21	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	603	2023年
79	1103	小笠大正2号橋	ハトノ原東線	その他	1970	2.60	8.42	8.00	20.80	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	582	2026年
80	1105	小島大正3号橋	小島北線	その他	1956	3.05	3.08	2.78	8.48	4,400	1	RC橋	開水路	有り	14.19	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2038年	519	2023年
81	1106	小島大正2号橋	小島西線	その他	1956	3.30	2.90	2.75	9.08	4,400	1	RC橋	開水路	有り	14.22	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2048年	98	2023年
82	1108	ハトノ原大正1号橋	ハトノ原西線	その他	1956	3.60	3.60	3.45	12.42	4,400	1	RC橋	開水路	有り	14.04	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
83	1114	二条前2号橋	二条旭線	その他	1977	2.60	5.70	5.30	13.78	4,400	1	RC橋	開水路	有り	15.2	2018年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2030年	788	2023年
84	1115	原熊谷4号橋	二条西線	その他	1960	10.20	5.80	4.60	46.92	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
85	1116	原熊谷2号橋	原1号線	その他	1960	7.23	3.65	3.25	23.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
86	1117	原熊谷3号橋	原西二条線	その他	1977	9.20	3.90	3.50	32.20	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
87	1119	西二条1号橋	二条6号線	その他	1994	2.15	4.70	4.10	8.82	4,400	1	RC橋	開水路	有り	14.93	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
88	1120	二条前1号橋	西二条12号線	その他	1995	3.25	8.00	7.50	24.38	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
89	1121	原熊谷1号橋	原中央線	その他	2004	12.80	6.20	5.00	64.00	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	---	---	0	2025年
90	1122	原谷川2号橋	原東西線	その他	1970	5.00	4.46	4.06	20.30	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
91	1123	南原橋	鳴池3号線	その他	1970	2.70	5.45	5.20	14.04	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	I	管理区分2	---	---	0	2022年
92	1124	原谷川3号橋	原6号線	その他	1984	3.55	4.70	4.10	14.56	4,400	1	RC橋	河川	有り	14.92	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	159	2023年
93	1125	宮川内牛島停車場1号橋	宮川内牛島停車場線	その他	1999	3.30	13.50	10.15	33.50	4,400	1	BOX	開水路	有り	13.2	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	1,424	2023年
94	2001	湾道橋	西ノ岡寺ノ上線	1級	1956	92.60	3.50	3.00	277.80	5,900	20	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	---	---	0	2025年
95	2002	西代橋	北中央線	1級	1972	15.50	6.50	6.00	93.00	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	塗替塗装工	2028年	7,614	2025年
96	2003	鈴川新橋	大規模幹線農道線	1級	1976	17.80	8.20	7.00	124.60	5,300	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年
97	2004	千代橋	大規模幹線農道線	1級	1978	22.90	9.70	8.50	194.65	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2026年	532	2025年
98	2005	西ノ宮2号橋	大規模幹線農道線	1級	1973	14.10	7.90	7.10	100.11	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	III	管理区分1	塗替塗装工	2020年	6,765	2025年
99	2006	高尾橋	南原1号線	1級	1973	55.00	4.80	4.00	220.00	5,300	2	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	---	---	0	2025年
100	2007	郡西ノ宮橋	郡中央線	2級	1978	17.00	7.80	7.00	119.00	5,300	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年

事業計画一覧 (3/13)

整理番号	橋梁コード	橋梁名	路線名称	道路種別	架設年度	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	橋面積(m ²)	委託費(千円)	径間数	橋種	考慮すべき事項			点検年度	健全性の診断	管理区分	修繕対策			点検実施時期
													路下条件	迂回路の有無	海岸からの距離(km)				対策内容	実施時期	概算事業費(千円)	
101	2008	山王子橋	山王子線	その他	1972	15.90	3.80	3.30	52.47	4,400	3	RC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅲ	管理区分3	断面修復工ほか	2033年	372	2025年
102	2009	第1榎原橋	山ノ本大木線	その他	1990	14.50	5.70	5.10	73.95	4,400	2	PC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分2	---	---	0	2025年
103	2010	第2榎原橋	北原線	その他	1994	17.60	5.20	4.00	70.40	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分3	---	---	0	2025年
104	2011	東野橋	東野線	その他	1972	16.40	5.00	4.00	65.60	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分3	---	---	0	2025年
105	2012	若宮橋	殿開大船戸線	その他	1983	29.40	5.00	4.00	117.60	5,300	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分3	断面修復工ほか	2033年	3,785	2025年
106	2013	峰延橋	殿開大場線	その他	1972	21.00	3.50	3.00	63.00	4,400	2	RC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分3	断面修復工ほか	2038年	2,472	2025年
107	2014	中州橋	殿開大場線	その他	1982	29.60	6.00	5.00	148.00	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分1	塗替塗装工ほか	2045年	64,966	2025年
108	2015	林高橋	林高線	その他	1981	21.55	5.00	4.00	86.20	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分3	断面修復工ほか	2048年	4,699	2025年
109	2016	新御所大橋	古田大井線	その他	1986	54.80	6.50	5.50	301.40	5,900	2	PC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分1	断面修復工ほか	2026年	8,207	2025年
110	2017	新高尾谷川橋	古田大井線	その他	1989	34.20	7.00	6.00	205.20	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分1	断面修復工ほか	2029年	678	2025年
111	2018	新安楽寺谷川橋	古田大井線	その他	1988	23.00	7.30	6.30	144.90	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分1	---	---	0	2025年
112	2019	新山王子橋	山王子深谷線	その他	1994	19.60	10.30	9.30	182.28	5,300	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分1	---	---	0	2025年
113	2020	高尾谷川側道橋	側道高尾北線	その他	1990	37.00	5.20	4.00	148.00	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分1	---	---	0	2025年
114	2022	高尾谷橋	船戸切幡上板5号線	その他	1966	29.90	4.50	4.20	125.58	5,300	4	RC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分1	断面修復工ほか	2026年	4,097	2025年
115	2023	法ヶ谷橋	大規模幹線農道線	1級	1972	10.70	7.80	7.00	74.90	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分1	断面修復工ほか	2032年	3,508	2025年
116	2024	西ノ宮1号橋	大規模幹線農道線	1級	1972	13.60	7.80	7.00	95.20	4,400	1	PC橋	その他	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分1	---	---	0	2025年
117	2025	翫城地2号橋	中央線	2級	1966	12.00	4.60	4.00	48.00	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分2	---	---	0	2025年
118	2026	翫城地1号橋	中央線	2級	1964	10.00	5.30	4.70	47.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	Ⅱ	管理区分2	断面修復工ほか	2024年	2,759	2026年
119	2027	金屋1号(下水田)橋	土成南線	その他	1983	10.40	5.80	5.00	52.00	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分2	---	---	0	2025年
120	2028	熊谷1号橋	実安笹草線	1級	1990	2.40	4.25	4.00	9.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	13.78	2018年	Ⅱ	管理区分2	---	---	0	2023年
121	2029	熊谷2号橋	実安笹草線	1級	1970	6.70	5.90	5.50	36.85	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	Ⅱ	管理区分2	断面修復工ほか	2045年	6,750	2026年
122	2030	田中1号橋	北中央線	1級	1970	3.30	6.80	6.80	22.44	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	Ⅱ	管理区分2	---	---	0	2026年
123	2031	田中2号橋	北中央線	1級	1970	3.70	6.80	6.50	24.05	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	Ⅱ	管理区分2	断面修復工ほか	2029年	1,328	2026年
124	2032	新池橋	北中央線	1級	1970	9.50	7.10	6.50	61.75	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	Ⅱ	管理区分2	---	---	0	2026年
125	2033	秋月橋	秋月八幡線	1級	1990	9.60	4.80	4.00	38.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	Ⅱ	管理区分2	---	---	0	2022年
126	2034	金蔵橋	成当浦ノ池線	1級	1990	7.00	6.00	5.50	38.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	Ⅱ	管理区分2	断面修復工ほか	2023年	2,318	2026年
127	2035	前田2号橋	大規模幹線農道線	1級	1976	4.40	8.00	7.10	31.24	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分1	---	---	0	2025年
128	2036	北原橋(大規模幹線農道線)	大規模幹線農道線	1級	1976	2.60	7.70	7.10	18.46	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分1	断面修復工ほか	2028年	1,173	2025年
129	2037	第3榎原橋	大規模幹線農道線	1級	1972	5.50	7.90	7.00	38.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分1	断面修復工ほか	2021年	2,522	2025年
130	2038	宝田橋(宝田西ノ宮線)	宝田西ノ宮線	1級	1973	3.60	8.10	7.75	27.90	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	Ⅱ	管理区分2	断面修復工ほか	2022年	1,674	2026年
131	2039	通学橋	通学横道線	1級	2002	9.00	11.50	10.50	94.50	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分2	---	---	0	2025年
132	2040	金屋橋	中央線	2級	1984	7.70	5.00	4.00	30.80	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2017年	Ⅱ	管理区分2	---	---	0	2022年
133	2041	郡南橋	郡中央線	2級	1990	3.00	8.12	6.50	19.50	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2017年	Ⅱ	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	791	2022年
134	2042	渋毛橋	渋毛線	2級	1972	3.20	8.90	8.10	25.92	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	Ⅱ	管理区分2	断面修復工ほか	2046年	5,433	2025年
135	2043	峰延2号橋	郡榎原線	2級	1990	2.70	4.40	4.10	11.07	4,400	1	RC橋	開水路	有り	14.21	2018年	Ⅱ	管理区分2	断面修復工ほか	2023年	623	2023年
136	2044	日吉橋	日吉線	2級	1965	5.00	6.14	5.70	28.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	Ⅱ	管理区分2	---	---	0	2026年
137	2045	安楽寺谷橋	安楽寺谷線	その他	1970	7.70	5.40	4.90	37.73	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	Ⅱ	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	1,271	2022年
138	2046	西谷橋(西谷1号線)	西谷1号線	その他	1970	3.50	5.40	5.00	17.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	Ⅱ	管理区分2	---	---	0	2026年
139	2047	佐古谷橋	宮ノ下休場線	その他	1990	4.00	4.50	4.00	16.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	11.55	2018年	Ⅱ	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	618	2023年
140	2048	佐古谷1号橋	山田線	その他	2009	7.40	8.70	8.00	59.20	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	Ⅱ	管理区分2	断面修復工ほか	2025年	3,569	2026年
141	2049	北谷橋	見坂線	その他	1956	3.30	4.70	4.30	14.19	4,400	1	RC橋	河川	有り	10.26	2018年	Ⅱ	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	521	2023年
142	2050	見坂橋	見坂線	その他	1956	2.70	3.70	3.70	9.99	4,400	1	RC橋	河川	有り	10.72	2018年	Ⅱ	管理区分3	---	---	0	2023年
143	2051	前原1号橋	藤原線	その他	1970	3.20	5.50	5.10	16.32	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	Ⅱ	管理区分2	断面修復工ほか	2036年	3,151	2026年
144	2052	前原2号橋	藤原前原線	その他	1990	3.30	5.10	4.70	15.51	4,400	1	RC橋	開水路	有り	12.5	2018年	Ⅱ	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	576	2023年
145	2053	藤原1号橋	藤原1号線	その他	1990	3.30	5.00	4.60	15.18	4,400	1	RC橋	開水路	有り	12.42	2018年	Ⅱ	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	564	2023年
146	2054	大桜橋	大桜1号線	その他	1970	3.20	5.00	4.60	14.72	4,400	1	RC橋	開水路	有り	12.73	2018年	Ⅱ	管理区分3	---	---	0	2023年
147	2055	中学校前橋	通学道路線	その他	1970	3.30	4.60	4.00	13.20	4,400	1	RC橋	開水路	有り	13.25	2018年	Ⅱ	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	818	2023年
148	2056	熊谷3号橋	牛屋谷漆畑線	その他	1990	5.40	5.20	4.80	25.92	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	Ⅱ	管理区分3	---	---	0	2022年
149	2057	丸山橋	牛屋谷漆畑線	その他	1990	3.10	5.60	5.00	15.50	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	Ⅱ	管理区分2	---	---	0	2022年
150	2058	熊谷4号橋	東部横線	その他	1965	6.40	5.60	5.10	32.64	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	Ⅱ	管理区分2	---	---	0	2026年

事業計画一覧(4/13)

整理番号	橋梁コード	橋梁名	路線名称	道路種別	架設年度	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	橋面積(m ²)	委託費(千円)	径間数	橋種	考慮すべき事項			点検年度	健全性の診断	管理区分	修繕対策			点検実施時期
													路下条件	迂回路の有無	海岸からの距離(km)				対策内容	実施時期	概算事業費(千円)	
151	2059	丸山1号橋	漆畑1号線	その他	1990	2.80	4.10	4.10	11.48	4,400	1	RC橋	開水路	有り	13.42	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	548	2023年
152	2060	寒方橋	寒方線	その他	2008	8.00	4.80	4.00	32.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
153	2061	前田1号橋	前田線	その他	1990	3.20	4.70	4.10	13.12	4,400	1	RC橋	河川	有り	13.21	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
154	2062	丸山2号橋	前田丸山線	その他	1990	3.30	6.60	6.30	20.79	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	757	2022年
155	2063	丸山3号橋	丸山線	その他	1970	2.90	4.20	3.60	10.44	4,400	1	RC橋	開水路	有り	13.61	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2040年	398	2023年
156	2064	実安橋	昌仙塚線	その他	1990	4.10	4.70	4.10	16.81	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
157	2065	大法寺橋	大法寺美緑線	その他	1970	3.00	4.90	4.60	13.80	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
158	2066	第2大法寺橋	大法寺美緑線	その他	1990	2.40	7.60	7.20	17.28	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2023年	898	2026年
159	2067	山ノ本1号橋	鈴川浦ノ池線	その他	1990	6.10	3.40	3.00	18.30	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
160	2068	山ノ本2号橋	鈴川浦ノ池線	その他	1990	4.80	5.00	4.60	22.08	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	996	2022年
161	2069	山ノ本3号橋(鈴川浦ノ池線)	鈴川浦ノ池線	その他	1972	12.00	3.10	2.80	33.60	4,400	2	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	575	2026年
162	2070	櫻原1号橋	山ノ本大木線	その他	1972	4.70	4.70	4.10	19.27	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
163	2071	櫻原2号橋	山ノ本大木線	その他	1990	2.60	5.70	5.10	13.26	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分2	---	---	0	2022年
164	2072	落合谷橋	落合北原線	その他	1956	5.00	2.10	2.10	10.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	13.21	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
165	2073	大木1号橋	峰延線	その他	1970	2.20	5.70	5.30	11.66	4,400	1	BOX	開水路	有り	14.15	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	431	2023年
166	2074	大木2号橋	大木実安線	その他	1970	3.30	3.80	3.50	11.55	4,400	1	RC橋	開水路	有り	14.1	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
167	2075	竹ノ花橋	矢松田中支線	その他	1970	7.20	3.40	3.00	21.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
168	2076	田中法輪寺橋	田中2号線	その他	1970	9.80	3.60	3.00	29.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
169	2077	田中大谷2号橋	美納地2号線	その他	1970	8.60	3.40	3.00	25.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
170	2078	美納地橋	高泰池ノ下線	その他	1970	3.90	4.80	4.50	17.55	4,400	1	RC橋	開水路	有り	15.15	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	546	2023年
171	2079	宝田橋(郡横道線)	郡横道線	その他	1979	10.10	3.60	3.00	30.30	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2036年	122	2025年
172	2080	浦池大池橋	西ノ宮1号線	その他	1990	6.10	4.60	4.20	25.62	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
173	2081	赤田橋	殿開大場線	その他	1972	10.10	4.40	4.00	40.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	1,810	2025年
174	2082	日吉1号橋	日吉浦ノ池線	その他	1990	7.80	4.60	4.00	31.20	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
175	2083	中筋橋	中筋1号線	その他	1990	6.70	4.80	4.00	26.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2044年	1,073	2022年
176	2084	蛭子橋	蛭子中筋線	その他	1990	6.10	4.50	4.00	24.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
177	2085	尾類橋	金屋尾類線	その他	1984	7.25	4.80	4.00	29.00	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
178	2086	間谷2号橋	乾金屋線	その他	1990	7.00	7.30	5.00	35.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2025年	2,582	2026年
179	2087	出口1号橋	出口線	その他	1990	6.40	5.70	4.50	28.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2044年	1,185	2022年
180	2088	出口2号橋(指谷2号橋)	出口支線	その他	1990	7.80	4.80	4.00	31.20	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	1,211	2022年
181	2089	指谷橋(指谷2号線)	指谷2号線	その他	1970	6.90	4.80	4.00	27.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
182	2090	間谷3号橋	中ノ王子支線	その他	1956	5.20	4.50	4.10	21.32	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
183	2091	一本松2号橋	一本松線	その他	1990	2.20	6.10	5.60	12.32	4,400	1	BOX	開水路	有り	13.22	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	458	2023年
184	2092	一本松1号橋	一本松線	その他	2001	2.70	9.50	9.20	24.84	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2031年	1,356	2026年
185	2093	間谷1号橋	金屋久保田線	その他	1956	6.40	5.20	4.70	30.08	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
186	2094	馬立橋	馬立線	その他	1990	2.80	7.20	6.90	19.32	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2040年	689	2022年
187	2095	上畑(太鼓坂)橋	上畑線	その他	1965	9.60	4.00	3.50	33.60	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2017年	III	管理区分3	塗替塗装工	2033年	4,359	2022年
188	2096	高尾熊ノ庄橋	高尾熊ノ庄線	その他	1970	4.20	4.00	3.60	15.12	4,400	1	RC橋	河川	有り	11.04	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
189	2097	一本松3号橋	一本松3号線	その他	1990	3.20	5.30	4.70	15.04	4,400	1	RC橋	開水路	有り	13.25	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	749	2023年
190	2098	日吉3号橋	蛭子中筋1号線	その他	1990	5.30	4.60	4.00	21.20	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
191	2099	落合谷1号橋	山ノ本1号線	その他	1990	4.70	4.60	4.00	18.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
192	2100	下間谷橋	久保田2号線	その他	1983	13.50	4.80	4.00	54.00	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
193	2101	大木西橋	大木西線	その他	1990	3.00	5.70	5.10	15.30	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分2	---	---	0	2022年
194	2102	はざま橋	はざま南原線	その他	1990	3.20	4.60	4.00	12.80	4,400	1	RC橋	開水路	有り	11.28	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
195	2103	筒井橋	筒井2号線	その他	1999	3.10	13.60	13.00	40.30	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2032年	2,257	2026年
196	2104	大木3号橋	大木支線	その他	1990	3.10	4.10	3.70	11.47	4,400	1	RC橋	開水路	有り	14.05	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
197	2105	高泰橋	高泰池ノ下支線	その他	1990	2.60	4.80	4.20	10.92	4,400	1	RC橋	開水路	有り	14.88	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
198	2106	下り松橋	下り松線	その他	1990	3.30	5.40	5.10	16.83	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2036年	3,098	2026年
199	2107	側道土成南橋	側道土成南線	その他	1990	4.20	10.60	9.80	41.16	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2021年	2,488	2026年
200	2108	側道土成北橋	側道土成北線	その他	1990	5.50	9.80	9.00	49.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2021年	2,987	2026年

事業計画一覧(5/13)

整理番号	橋梁コード	橋梁名	路線名称	道路種別	架設年度	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	橋面積(m ²)	委託費(千円)	径間数	橋種	考慮すべき事項			点検年度	健全性の診断	管理区分	修繕対策			点検実施時期
													路下条件	迂回路の有無	海岸からの距離(km)				対策内容	実施時期	概算事業費(千円)	
201	2109	西谷側道北橋	側道高尾北線	その他	1990	5.40	6.00	5.00	27.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2027年	1,711	2026年
202	2110	西谷側道南橋	側道高尾南線	その他	1990	5.40	6.00	5.00	27.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2021年	1,711	2026年
203	2111	宮ノ下第1橋	宮ノ下けやき原線	その他	1990	5.15	6.40	6.00	30.90	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2039年	5,868	2026年
204	2112	宮ノ下第2橋	宮ノ下けやき原線	その他	1990	5.60	4.50	4.00	22.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	1,020	2022年
205	2113	西久保2号橋	西久保2号支線	その他	1990	2.70	5.95	5.80	15.66	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2030年	888	2022年
206	2114	一本松6号橋	一本松6号線	その他	1990	3.40	5.30	4.90	16.66	4,400	1	RC橋	開水路	有り	13.2	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	603	2023年
207	2115	熊谷5号橋	東原原田市線	その他	1970	4.50	3.00	3.00	13.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	13.79	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
208	2116	八丁橋	八丁線	その他	1955	10.80	4.00	3.60	38.88	4,400	2	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
209	2117	日吉大場橋	日吉大場線	その他	1990	7.20	4.60	4.00	28.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
210	2118	吉田神ノ木1号橋	吉田神ノ木1号線	その他	1990	3.20	5.10	4.50	14.40	4,400	1	RC橋	開水路	有り	12.83	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2044年	555	2023年
211	2119	伊月出口1号橋	伊月出口線	その他	1990	3.60	17.80	4.00	14.40	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	2,659	2022年
212	2120	明月1号橋	明月1号線	その他	1956	6.30	4.40	4.40	27.72	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
213	2121	山ノ本3号橋(鈴川浦ノ池線)	山ノ本3号線	その他	1990	4.60	3.80	3.00	13.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	13.35	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
214	2122	船戸切幡上板2号橋(法林寺橋)	船戸切幡上板2号線	その他	1956	4.40	6.95	6.40	28.17	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2029年	823	2026年
215	2123	熊谷橋	船戸切幡上板3号線	その他	1956	3.90	3.60	3.60	14.04	4,400	1	RC橋	河川	有り	13.08	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	507	2023年
216	2124	西谷橋(船戸切幡上板5号線)	船戸切幡上板5号線	その他	1970	3.00	6.40	5.60	16.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2049年	3,287	2026年
217	2125	出口3号橋	出口3号線	その他	1990	7.20	6.70	5.50	39.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
218	2126	大場1号橋	大場1号線	その他	1990	5.40	4.60	4.20	22.68	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	156	2022年
219	2127	佐古2号橋	佐古2号線	その他	1970	3.50	6.10	6.10	21.35	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	塗替塗装工	2021年	1,048	2026年
220	2128	水田橋	川原田3号線	その他	1982	10.70	4.00	3.00	32.10	4,400	1	PC橋	河川	有り	16	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2038年	136	2023年
221	3001	九栗谷橋	中央東西線	1級	1966	15.00	11.00	10.30	154.50	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	塗替塗装工	2030年	8,157	2025年
222	3002	松崎谷橋	中央東西線	1級	1990	12.70	9.20	8.20	104.14	5,300	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年
223	3003	中大久保谷橋	中央東西線	1級	1967	58.20	9.30	8.60	500.52	7,300	3	鋼橋	河川	有り	99	2020年	III	管理区分1	断面修復工ほか	2022年	34,713	2025年
224	3004	伊沢谷橋	中央東西線	1級	1972	112.00	6.70	6.00	672.00	7,300	5	鋼橋	河川	有り	99	2020年	III	管理区分1	断面修復工ほか	2023年	85,688	2025年
225	3005	九栗谷1号橋	清原11号線	その他	1993	20.60	5.20	4.00	82.40	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
226	3006	九栗谷2号橋	清原12号線	その他	1993	20.60	5.20	4.00	82.40	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
227	3007	中坪橋	岩津川久保線	1級	1969	19.60	6.80	6.00	117.60	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	塗替塗装工	2021年	9,883	2025年
228	3008	第2中坪橋	岩津川久保線	1級	1969	27.50	6.80	6.00	165.00	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	塗替塗装工	2028年	36,071	2025年
229	3009	中河原橋	南川原善地線	1級	1971	26.20	6.80	6.00	157.20	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	塗替塗装工	2028年	17,892	2025年
230	3010	善地橋	南川原善地線	1級	2017	16.80	10.32	9.12	153.22	5,300	1	鋼橋	河川	有り	23.13	2018年	II	管理区分1	---	---	0	2023年
231	3011	橋嶽橋	阿讃山麓線	1級	1974	14.55	8.80	8.00	116.40	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	III	管理区分1	塗替塗装工ほか	2046年	24,151	2025年
232	3012	貴船橋	阿讃山麓線	1級	1977	32.00	8.20	7.00	224.00	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2024年	16,043	2025年
233	3013	芝生谷大橋	阿讃山麓線	1級	1982	107.00	8.20	7.00	749.00	7,300	4	鋼橋	河川	有り	99	2020年	III	管理区分1	断面修復工ほか	2022年	26,924	2025年
234	3014	土柱大橋	阿讃山麓線	1級	1979	60.00	8.20	7.00	420.00	5,900	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2032年	27,239	2025年
235	3015	伊沢谷川橋	阿讃山麓線	1級	1974	66.00	7.50	6.50	429.00	5,900	3	鋼橋	河川	有り	99	2020年	III	管理区分1	塗替塗装工	2020年	20,389	2025年
236	3016	五明谷大橋	阿讃山麓線	1級	1983	61.40	8.20	7.00	429.80	5,900	2	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2025年	15,274	2025年
237	3017	日吉谷川橋	阿讃山麓線	1級	1987	44.00	8.20	7.00	308.00	5,900	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2033年	20,853	2025年
238	3018	市ノ瀬橋	井出口大久保線	2級	1986	16.40	5.00	4.00	65.60	4,400	1	PC橋	河川	無し	99	2020年	II	管理区分2	---	---	0	2025年
239	3019	大久保谷川2号橋	井出口大久保線	2級	1980	15.10	3.40	3.00	45.30	4,400	2	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2030年	2,103	2025年
240	3020	立石橋(山尻西ノ岡線)	山尻西ノ岡線	2級	2019	22.50	6.20	5.00	112.50	5,300	1	PC橋	河川	有り	19.76	2018年	II	管理区分1	---	---	0	2023年
241	3021	明王院橋	勝命谷島線	その他	1978	23.90	3.70	3.00	71.70	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
242	3022	広間橋	中ノ坪三本柳線	その他	1971	27.00	4.70	4.00	108.00	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2033年	159	2025年
243	3023	五明橋	南整理赤坂線	その他	1972	15.60	6.30	5.50	85.80	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2021年	5,325	2025年
244	3024	九栗谷川谷島2号橋	勝命北谷島線	その他	1978	20.40	6.80	6.00	122.40	5,300	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年
245	3025	五明谷東整理橋	東整理2号線	その他	1978	24.50	2.60	2.00	49.00	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
246	3026	長峰大橋	東長峰北西谷線	その他	1984	50.70	7.00	6.00	304.20	5,900	2	鋼橋	河川	有り	99	2020年	III	管理区分1	断面修復工ほか	2021年	16,570	2025年
247	3027	王地橋	大道南2号線	その他	1987	25.00	6.70	5.50	137.50	5,300	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2033年	5,642	2025年
248	3028	町道西林2号線橋	西林2号線	その他	1990	44.10	4.20	3.00	132.30	5,300	3	鋼橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分2	---	---	0	2025年
249	3029	井出口橋	下原西ノ岡線	その他	1986	30.00	7.00	6.00	180.00	5,300	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2026年	5,401	2025年
250	3030	姥ヶ谷橋	西長峰工業団地線	その他	1992	14.05	10.30	9.30	130.67	5,300	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年

事業計画一覧(6/13)

整理番号	橋梁コード	橋梁名	路線名称	道路種別	架設年度	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	橋面積(m ²)	委託費(千円)	径間数	橋種	考慮すべき事項			点検年度	健全性の診断	管理区分	修繕対策			点検実施時期
													路下条件	迂回路の有無	海岸からの距離(km)				対策内容	実施時期	概算事業費(千円)	
251	3031	西林橋	西林西長峰線	その他	1992	56.30	8.70	7.00	394.10	5,900	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2027年	26,325	2025年
252	3032	天西山橋	天西山1号線	その他	1993	42.30	5.00	4.00	169.20	5,300	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2030年	10,669	2025年
253	3033	西長峰橋	側道南東長峰西長峰線	その他	1992	47.40	4.70	3.00	142.20	5,300	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2034年	41,234	2025年
254	3034	北岡西長峰橋	北岡西長峰線	その他	1992	45.80	5.70	4.00	183.20	5,300	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2034年	47,385	2025年
255	3035	中長峰橋	南西谷中長峰線	その他	1992	51.10	5.70	4.00	204.40	5,300	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2036年	42,989	2025年
256	3036	東長峰橋	中長峰東長峰線	その他	1992	42.80	5.70	4.00	171.20	5,300	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2036年	37,401	2025年
257	3037	王子川赤坂橋	赤坂2号線	その他	1992	48.00	6.70	5.00	240.00	5,300	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2029年	12,923	2025年
258	3038	名東岡橋	桜ノ岡棚ヶ窪線	その他	1992	55.90	6.70	5.00	279.50	5,900	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2030年	17,737	2025年
259	3039	桜ノ岡橋	側道南桜ノ岡日吉谷線	その他	1992	42.10	5.70	4.00	168.40	5,300	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2021年	9,032	2025年
260	3040	十善地橋	十善地線	2級	1992	56.00	6.70	5.00	280.00	5,900	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2029年	20,767	2025年
261	3041	十善地5号橋	十善地5号線	その他	1993	56.60	5.70	4.00	226.40	5,300	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2027年	18,114	2025年
262	3042	小倉棚ヶ窪橋	側道北東正広小倉線	その他	1993	41.40	5.70	4.00	165.60	5,300	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2037年	43,523	2025年
263	3043	小倉1号橋	小倉2号線	その他	1993	42.10	6.00	5.00	210.50	5,300	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2030年	15,261	2025年
264	3044	中央芝生谷橋	中央東西線	1級	1965	13.00	7.00	6.40	83.20	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	III	管理区分1	断面修復工ほか	2033年	384	2025年
265	3045	別埜池井出口2号橋	阿讃山麓線	1級	1972	13.50	7.80	7.00	94.50	4,400	1	PC橋	開水路	有り	99	2020年	III	管理区分1	断面修復工ほか	2022年	3,639	2025年
266	3046	鳶谷橋	阿讃山麓線	1級	1972	10.40	7.80	7.00	72.80	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年
267	3047	松崎谷川3号橋	西清原土地線	その他	1988	12.70	5.20	4.00	50.80	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
268	3048	松崎谷川4号橋	西清原土地線	その他	1989	12.20	5.20	4.00	48.80	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
269	3049	阿波用水馬場橋	東村馬場線	その他	1961	4.80	5.80	5.60	26.88	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2021年	1,551	2026年
270	3050	阿波用水善地1号橋	南川原善地線	1級	1970	7.20	4.40	4.10	29.52	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	I	管理区分2	---	---	0	2022年
271	3051	下喜来谷川8号橋	南谷島下喜来線	その他	1972	2.30	7.15	7.15	16.45	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2034年	2,749	2026年
272	3052	地林谷北整理1号橋	東村馬場線	その他	1961	3.85	7.00	6.50	25.03	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
273	3053	中ノ坪排水広間橋	岩津川久保線	1級	1972	4.00	7.60	7.60	30.40	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2020年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2030年	1,826	2025年
274	3054	中央願成寺谷橋	中央東西線	1級	1967	4.25	12.25	11.65	49.51	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2027年	3,082	2025年
275	3055	中央五明谷橋	中央東西線	1級	2001	9.90	11.55	10.55	104.45	5,300	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年
276	3056	中央倉谷橋	中央東西線	1級	1970	4.70	6.00	5.20	24.44	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	---	---	0	2026年
277	3057	中央善地橋	中央東西線	1級	1970	7.10	6.80	6.00	42.60	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分1	---	---	0	2026年
278	3058	日吉谷馬場1号橋	東村馬場線	その他	1961	6.70	6.50	6.10	40.87	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
279	3059	野神谷橋	中央東西線	1級	1990	6.20	11.10	10.50	65.10	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2027年	4,065	2025年
280	3060	薬師谷川8号橋	阿讃山麓線	その他	1974	6.20	8.03	7.03	43.59	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年
281	3061	立割谷橋	一ノ瀬引地線	2級	1942	4.52	6.60	6.00	27.12	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2022年	2,081	2026年
282	3062	松谷山尻橋	山尻西ノ岡線	2級	1956	2.70	4.30	3.90	10.53	4,400	1	RC橋	河川	有り	18.8	2018年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2031年	417	2023年
283	3063	松谷西ノ岡1号橋	山尻西ノ岡線	2級	1977	4.80	4.55	3.95	18.96	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分2	---	---	0	2022年
284	3064	倉谷中ノ坪橋	十善地線	2級	2001	2.40	6.10	5.70	13.68	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
285	3065	大久保小谷橋	井出口大久保線	2級	1980	3.70	7.80	7.80	28.86	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	460	2026年
286	3066	大久保谷川1号橋	井出口大久保線	2級	1970	8.10	3.30	3.00	24.30	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分2	---	---	0	2022年
287	3067	長光寺谷1号橋	西長峰北西谷線	2級	1961	4.65	5.80	5.50	25.58	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
288	3068	長光寺谷2号橋	西長峰北西谷線	2級	1977	6.95	6.50	6.10	42.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
289	3069	鳶谷西ノ岡橋	山尻西ノ岡線	2級	1970	4.50	3.95	3.55	15.98	4,400	1	RC橋	河川	有り	19.9	2018年	II	管理区分2	---	---	0	2023年
290	3070	南谷1号橋	一ノ瀬引地線	2級	2005	6.00	5.30	4.50	27.00	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2041年	1,060	2022年
291	3071	南谷2号橋	一ノ瀬引地線	2級	2005	2.90	8.00	5.70	16.53	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
292	3072	南谷3号橋	一ノ瀬引地線	2級	2005	2.90	9.00	4.50	13.05	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
293	3073	別埜池貴船橋	井出口大久保線	2級	1989	2.90	6.00	6.00	17.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分2	---	---	0	2022年
294	3074	薬師谷川4号橋	小倉正広線	2級	1974	4.55	8.30	7.60	34.58	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2022年	2,066	2026年
295	3075	いざり土谷橋	井出口大久保線	2級	1980	3.20	5.40	5.10	16.32	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2021年	926	2022年
296	3076	下喜来谷川7号橋	下喜来7号線	その他	1956	2.20	3.90	3.30	7.26	4,400	1	その他	河川	有り	18.84	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2038年	89	2023年
297	3077	下喜来谷川6号橋	下喜来8号線	その他	2001	2.15	4.60	4.60	9.89	4,400	1	BOX	河川	有り	18.95	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	292	2023年
298	3079	下喜来谷川4号橋	下喜来清原1号線	その他	1970	2.50	3.00	3.00	7.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	19.15	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2043年	102	2023年
299	3080	下喜来谷川2号橋	勝命7号線	その他	2001	2.75	5.45	5.15	14.16	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分2	---	---	0	2022年
300	3081	下喜来谷川1号橋	勝命下喜来南線	その他	2001	5.45	5.50	4.90	26.71	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年

事業計画一覧 (7/13)

整理番号	橋梁コード	橋梁名	路線名称	道路種別	架設年度	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	橋面積(m ²)	委託費(千円)	径間数	橋種	考慮すべき事項			点検年度	健全性の診断	管理区分	修繕対策			点検実施時期
													路下条件	迂回路の有無	海岸からの距離(km)				対策内容	実施時期	概算事業費(千円)	
301	3082	九栗谷川清原7号橋	勝命清原線	その他	2001	7.80	4.50	3.50	27.30	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2032年	1,389	2022年
302	3083	九栗谷川清原6号橋	清原7号線	その他	2001	8.70	2.80	2.00	17.40	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
303	3084	九栗谷川清原5号橋	勝命清原線	その他	1993	12.70	4.80	4.00	50.80	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
304	3085	九栗谷川清原4号橋	下喜来清原1号線	その他	1993	12.80	3.80	3.00	38.40	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2040年	5,209	2025年
305	3086	九栗谷川清原3号橋	勝命清原線	その他	1993	11.90	3.00	2.70	32.13	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
306	3087	九栗谷川清原2号橋	勝命清原線	その他	1993	12.10	1.80	1.50	18.15	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2033年	61	2025年
307	3088	九栗谷川清原1号橋	勝命清原線	その他	1993	12.10	2.70	2.00	24.20	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
308	3089	九栗谷川西清原3号橋	勝命清原線	その他	1993	12.20	2.80	2.10	25.62	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
309	3090	九栗谷川西清原2号橋	勝命清原線	その他	1978	12.10	1.45	1.05	12.71	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2040年	693	2025年
310	3091	九栗谷川西清原1号橋	勝命清原線	その他	1978	12.65	1.50	1.20	15.18	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2033年	51	2025年
311	3092	九栗谷川谷島1号橋	勝命勝命北線	その他	1978	12.40	3.50	3.00	37.20	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
312	3094	谷島谷川南谷島橋	谷島南谷島1号線	その他	1970	2.00	8.80	8.80	17.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2037年	3,039	2026年
313	3095	谷島谷川1号橋	谷島南谷島1号線	その他	1977	2.60	3.10	3.10	8.06	4,400	1	RC橋	河川	有り	20.93	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
314	3096	谷島谷川2号橋	谷島南谷島1号線	その他	1956	2.70	8.40	8.40	22.68	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2045年	3,883	2026年
315	3097	松崎谷川王地橋	王地2号線	その他	1989	5.70	4.70	4.30	24.51	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
316	3098	千貫坂橋	大道南南谷島線	その他	1991	5.05	5.50	5.25	26.51	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分2	---	---	0	2022年
317	3099	寺サコ谷庚申原橋	庚申原4号線	その他	1956	2.85	6.30	6.30	17.96	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
318	3100	西松崎谷王地橋	王地王地南線	その他	1970	2.70	3.40	3.20	8.64	4,400	1	RC橋	河川	有り	21	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	426	2023年
319	3101	野神1号橋	野神1号線	その他	2001	2.75	3.70	3.30	9.08	4,400	1	RC橋	河川	有り	20.6	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
320	3103	柏谷橋	西ノ岡1号線	その他	2001	6.00	2.50	2.50	15.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	19.11	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
321	3104	別埜池井出口1号橋	井出口4号線	その他	1977	2.95	9.30	9.10	26.85	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
322	3105	願成寺谷西ノ岡橋(西ノ岡東柴生線)	西ノ岡東柴生線	その他	1989	5.35	4.60	3.80	20.33	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	829	2022年
323	3106	松谷西ノ岡2号橋	西ノ岡東柴生線	その他	2001	3.20	4.60	4.25	13.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	19.77	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
324	3107	願成寺谷西ノ岡橋(八丁原西ノ岡線)	八丁原西ノ岡線	その他	1977	6.00	5.65	4.60	27.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	1,028	2022年
325	3108	願成寺谷北五味知3号橋	北五味知山ノ神線	その他	1977	3.80	2.95	2.95	11.21	4,400	1	RC橋	河川	有り	20.23	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
326	3109	願成寺谷北五味知2号橋	北柴生北五味知線	その他	1965	3.30	3.70	3.50	11.55	4,400	1	RC橋	河川	有り	20.37	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2044年	408	2023年
327	3110	願成寺谷北五味知1号橋	北五味知南五味知2号線	その他	1970	4.05	4.45	4.45	18.02	4,400	1	RC橋	河川	有り	20.58	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	652	2023年
328	3111	願成寺谷東柴生3号橋	南五味知綱懸線	その他	1977	4.50	2.70	2.50	11.25	4,400	1	RC橋	河川	有り	20.74	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
329	3112	願成寺谷東柴生1号橋	東原南五味知3号線	その他	1965	3.60	5.10	4.50	16.20	4,400	1	RC橋	河川	有り	20.9	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
330	3113	願成寺谷東原5号橋	東原南五味知1号線	その他	1977	3.70	4.25	3.85	14.25	4,400	1	RC橋	河川	有り	21.17	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	556	2023年
331	3114	願成寺谷東原4号橋	東原3号線	その他	1977	3.30	3.50	3.20	10.56	4,400	1	RC橋	河川	有り	21.27	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
332	3116	願成寺谷東原2号橋	東原1号線	その他	1977	4.00	1.95	1.95	7.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	21.41	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
333	3117	願成寺谷東原1号橋	元町東原線	その他	1970	8.70	6.25	5.85	50.90	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2023年	3,056	2026年
334	3118	馬喰谷元町橋	元町1号線	その他	1991	3.20	14.60	14.20	45.44	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	2,566	2022年
335	3119	馬喰谷岡地橋	伊沢岡地線	その他	2001	2.15	9.72	8.10	17.42	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
336	3121	馬喰谷伊沢田1号橋	伊沢田丸山線	その他	2001	3.37	5.45	5.15	17.36	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
337	3122	馬喰谷大道北1号橋	伊沢田大道北線	その他	2001	4.60	3.50	3.00	13.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	22.37	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
338	3123	馬喰谷前島橋	伊沢田前島線	その他	1991	6.05	5.60	4.80	29.04	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
339	3124	馬喰谷大道北2号橋	大道北前島1号線	その他	2001	3.40	20.00	17.85	60.69	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	2,375	2022年
340	3126	薬師小倉橋	小倉東正広線	その他	1965	2.40	2.80	2.80	6.72	4,400	1	RC橋	河川	有り	20.7	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
341	3127	薬師谷川7号橋	小倉13号線	その他	1970	3.60	2.80	2.50	9.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	21.11	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
342	3128	薬師谷川6号橋	西正広2号線	その他	1977	5.70	4.40	4.00	22.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
343	3129	薬師谷川5号橋	小倉9号線	その他	1989	5.50	5.00	4.00	22.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
344	3130	薬師谷川3号橋	東条小倉線	その他	1970	4.65	3.00	3.00	13.95	4,400	1	RC橋	河川	有り	21.34	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2049年	102	2023年
345	3131	薬師谷川2号橋	東条小倉線	その他	1970	4.45	2.50	2.50	11.13	4,400	1	RC橋	河川	有り	21.48	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
346	3132	薬師谷川1号橋	東条小倉線	その他	2001	4.80	3.00	3.00	14.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	21.52	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
347	3133	土柱谷橋	桜ノ岡2号線	その他	1976	6.00	4.15	4.15	24.90	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
348	3134	橋谷桜ノ岡2号橋	桜ノ岡6号線	その他	1976	4.80	3.50	3.10	14.88	4,400	1	RC橋	河川	有り	22.35	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
349	3135	橋谷桜ノ岡1号橋	桜ノ岡8号線	その他	1976	4.60	4.40	4.00	18.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
350	3136	倉谷橋	医王寺十善地線	その他	2001	7.90	4.65	3.85	30.42	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年

事業計画一覧（8/13）

整理番号	橋梁コード	橋梁名	路線名称	道路種別	架設年度	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	橋面積(m ²)	委託費(千円)	径間数	橋種	考慮すべき事項			点検年度	健全性の診断	管理区分	修繕対策			点検実施時期
													路下条件	迂回路の有無	海岸からの距離(km)				対策内容	実施時期	概算事業費(千円)	
351	3138	阿波用水中ノ坪2号橋	小倉中ノ坪線	その他	1970	4.20	3.85	3.60	15.12	4,400	1	RC橋	開水路	有り	22.63	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
352	3139	阿波用水善地2号橋	善地中ノ坪1号線	その他	2001	4.00	5.45	4.95	19.80	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
353	3140	中ノ坪排水中ノ坪3号橋	高垣中ノ坪1号線	その他	2001	4.30	4.40	4.00	17.20	4,400	1	BOX	開水路	有り	23	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2044年	658	2023年
354	3141	芝生谷中ノ坪橋	居屋敷南整理線	その他	1956	8.80	3.00	2.56	22.53	4,400	2	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	895	2022年
355	3142	中ノ坪排水中ノ坪2号橋	居屋敷南整理線	その他	1965	4.30	3.80	3.50	15.05	4,400	1	RC橋	開水路	有り	23.2	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	557	2023年
356	3143	中ノ坪排水中ノ坪1号橋	高垣三本柳線	その他	1965	5.20	4.70	4.10	21.32	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
357	3144	川久保谷1号橋	川久保三本柳1号線	その他	1970	3.10	4.50	4.10	12.71	4,400	1	RC橋	開水路	有り	23.14	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	472	2023年
358	3145	中ノ坪排水川久保1号橋	川久保1号線	その他	2001	9.00	4.80	4.00	36.00	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	1,504	2022年
359	3146	中ノ坪排水川久保2号橋	川久保三本柳1号線	その他	2001	6.60	5.40	4.90	32.34	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
360	3147	中ノ坪排水川久保3号橋	川久保三本柳2号線	その他	2001	8.90	4.80	4.00	35.60	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	1,608	2022年
361	3148	地林谷曲橋	南整理赤坂線	その他	2001	7.00	8.50	8.00	56.00	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
362	3149	地林谷東整理3号橋	東整理馬場線	その他	2001	7.75	4.90	4.10	31.78	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
363	3150	地林谷東整理1号橋	東整理4号線	その他	1989	4.80	4.70	4.10	19.68	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
364	3151	日吉谷北整理2号橋	北整理東整理線	その他	2001	6.40	4.60	4.00	25.60	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2045年	1,024	2022年
365	3152	東王子谷橋	赤坂3号線	その他	1989	4.40	2.50	2.20	9.68	4,400	1	RC橋	河川	有り	22.84	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
366	3153	王子谷橋	王子川馬場線	その他	1976	4.10	4.40	4.00	16.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	23.03	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	625	2023年
367	3154	日吉谷馬場3号橋	側道南日吉谷線	その他	1989	6.80	4.80	4.00	27.20	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	1,252	2022年
368	3155	日吉谷北整理1号橋	東整理馬場線	その他	2001	8.40	4.80	4.00	33.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	23.4	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
369	3156	日吉谷馬場2号橋	西整理馬場線	その他	1965	6.60	2.80	2.40	15.84	4,400	1	RC橋	河川	有り	23.6	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
370	3157	阿波用水西整理2号橋	南整理南西谷線	その他	1976	4.50	4.40	4.10	18.45	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2041年	692	2022年
371	3158	地林谷北整理2号橋	西整理馬場線	その他	1976	3.60	3.50	3.00	10.80	4,400	1	RC橋	開水路	有り	23.68	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
372	3159	地林谷西整理橋	南西谷西整理線	その他	1976	2.70	2.45	2.45	6.62	4,400	1	RC橋	開水路	有り	24.01	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
373	3160	阿波用水西整理1号橋	西整理3号線	その他	1976	4.30	2.30	2.20	9.46	4,400	1	鋼橋	開水路	有り	24.07	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
374	3161	阿波用水北岡橋	西整理北岡線	その他	1976	4.20	4.40	4.10	17.22	4,400	1	RC橋	開水路	有り	24.4	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	658	2023年
375	3162	姥ヶ谷西林2号橋	北岡西林線	その他	1989	4.20	4.30	4.00	16.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	24.71	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
376	3163	阿波用水南整理橋	南整理6号線	その他	1976	5.00	3.70	3.10	15.50	4,400	1	RC橋	開水路	有り	24.56	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	628	2023年
377	3164	姥ヶ谷西林1号橋	西林1号線	その他	1976	4.70	3.00	2.50	11.75	4,400	1	RC橋	河川	有り	24.63	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
378	3165	阿波用水西林橋	西林岩津線	その他	1976	4.70	2.00	1.90	8.93	4,400	1	RC橋	開水路	有り	24.62	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
379	3166	切戸谷植桜橋	植桜西長峰線	その他	1989	4.00	4.70	4.10	16.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	25.1	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
380	3167	阿波用水乙岩津橋	乙岩津岩津線	その他	1961	4.20	8.30	8.10	34.02	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	I	管理区分2	---	---	0	2026年
381	3168	切戸谷乙岩津2号橋	西林乙岩津線	その他	1978	2.40	8.10	8.10	19.44	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
382	3169	切戸谷乙岩津1号橋	乙岩津2号線	その他	1976	4.00	2.80	2.80	11.20	4,400	1	RC橋	河川	有り	25.09	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	415	2023年
383	3170	岩津小橋	乙岩津岩津線	その他	1961	5.40	8.40	7.60	41.04	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2023年	2,450	2026年
384	3171	泉谷橋	大久保1号線	その他	1980	6.00	3.30	3.00	18.00	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	803	2022年
385	3172	勝命北1号橋	勝命北1号線	その他	1970	2.00	4.00	4.00	8.00	4,400	1	PC橋	開水路	有り	20.06	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	281	2023年
386	3173	勝命北2号橋	勝命下喜来南線	その他	1970	2.00	3.50	3.50	7.00	4,400	1	PC橋	開水路	有り	20.03	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
387	3174	芝生谷桜ノ岡2号橋	桜ノ岡5号線	その他	1970	8.00	4.40	4.00	32.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	1,113	2022年
388	3175	阿波用水十善地橋	善地十善地線	その他	1965	4.10	4.30	4.00	16.40	4,400	1	RC橋	開水路	有り	22.7	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
389	3176	芝生谷五明橋	五明東整理線	その他	1965	11.48	3.60	3.00	34.44	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
390	3178	地林谷東整理2号橋	北整理東整理線	その他	2001	4.20	4.60	4.00	16.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
391	3179	地林谷北整理3号橋	南整理馬場線	その他	1976	4.00	4.00	3.50	14.00	4,400	1	RC橋	開水路	有り	23.7	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
392	3180	地林谷北整理4号橋	南整理南西谷線	その他	1976	2.40	4.70	4.30	10.32	4,400	1	RC橋	開水路	有り	24.1	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	353	2023年
393	3182	中ノ坪排水中ノ坪4号橋	高垣中ノ坪2号線	その他	2001	3.60	5.00	4.60	16.56	4,400	1	BOX	開水路	有り	22.88	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2045年	620	2023年
394	3183	倉谷医王寺1号橋	医王寺2号線	その他	1956	2.55	8.10	8.10	20.66	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
395	3184	倉谷医王寺2号橋	医王寺1号線	その他	1970	3.80	2.90	2.90	11.02	4,400	1	RC橋	河川	有り	22.6	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
396	3185	願成寺谷北五味知4号橋	北五味知2号線	その他	1942	3.35	5.90	5.90	19.77	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
397	3186	松崎谷川谷島北橋	谷島北王地線	その他	1991	5.40	4.70	4.10	22.14	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
398	3187	立割伊沢谷東縁1号橋	立割伊沢谷東縁線	その他	1991	13.40	3.80	3.00	40.20	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
399	3188	谷島谷川3号橋	谷島7号線	その他	1977	2.00	5.00	5.00	10.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分2	---	---	0	2022年
400	3189	安政野神1号橋	安政野神1号線	その他	2001	2.20	6.10	5.40	11.88	4,400	1	BOX	開水路	有り	20.28	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	473	2023年

事業計画一覧(9/13)

整理番号	橋梁コード	橋梁名	路線名称	道路種別	架設年度	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	橋面積(m ²)	委託費(千円)	径間数	橋種	考慮すべき事項			点検年度	健全性の診断	管理区分	修繕対策			点検実施時期
													路下条件	迂回路の有無	海岸からの距離(km)				対策内容	実施時期	概算事業費(千円)	
401	3190	薬師谷川9号橋	側道北東正広小倉線	その他	1977	4.55	9.30	8.50	38.68	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2020年	2,287	2026年
402	3191	薬師谷川10号橋	側道南東正広小倉線	その他	1977	4.70	10.00	9.20	43.24	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2020年	2,520	2026年
403	3192	松谷西ノ岡3号橋	側道北西ノ岡山ノ神線	その他	1977	3.75	13.70	12.90	48.38	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2027年	2,714	2026年
404	3193	鳶谷西ノ岡2号橋	側道北西ノ岡山ノ神線	その他	1977	4.20	10.80	10.00	42.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2020年	2,472	2026年
405	3194	松谷西ノ岡4号橋	側道南西ノ岡山ノ神線	その他	1977	3.70	15.70	14.90	55.13	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2021年	3,063	2026年
406	3195	鳶谷西ノ岡3号橋	側道南西ノ岡山ノ神線	その他	1977	4.40	10.75	9.95	43.78	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2021年	2,524	2026年
407	3196	別荘池井出口3号橋	井出口高架橋下1号線	その他	1977	2.70	9.25	9.25	24.98	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2030年	1,333	2026年
408	3197	長光寺谷3号橋	側道北東長峰日吉谷線	その他	1989	7.10	5.00	4.00	28.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分1	---	---	0	2022年
409	3198	日吉谷馬場4号橋	側道北東長峰日吉谷線	その他	1989	9.80	5.00	4.00	39.20	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分1	---	---	0	2022年
410	3199	土柱谷2号橋	側道南東正広小倉線	その他	1989	6.80	5.00	4.00	27.20	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分1	---	---	0	2022年
411	3200	芝生川1号橋	側道北東正広小倉線	その他	1989	7.30	10.50	9.50	69.35	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2032年	4,353	2025年
412	3201	芝生川2号橋	側道南東正広小倉線	その他	1989	8.30	10.50	9.50	78.85	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2027年	4,841	2025年
413	3202	西長峰工業団地1号橋	西長峰工業団地1号線	その他	1961	7.20	6.75	5.75	41.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
414	3203	西長峰工業団地2号橋	西長峰工業団地1号線	その他	2001	4.60	7.70	7.20	33.12	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2040年	1,030	2022年
415	3204	東整理1号橋	東整理1号線	その他	2001	2.65	4.60	4.60	12.19	4,400	1	BOX	開水路	有り	23.72	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	441	2023年
416	3205	八丁原梅ノ木原1号橋	八丁原梅ノ木原線	その他	1965	3.00	4.90	4.00	12.00	4,400	1	RC橋	開水路	有り	19.88	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
417	3206	願成寺谷東原6号橋	東原11号線	その他	1970	4.10	3.50	3.10	12.71	4,400	1	RC橋	河川	有り	21.3	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
418	3207	中ノ坪6号橋	善地中ノ坪1号線	その他	2001	2.40	10.50	10.10	24.24	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2040年	778	2022年
419	3208	第2南谷島橋	南谷島3号線	その他	1991	2.05	3.35	3.05	6.25	4,400	1	RC橋	河川	有り	21	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
420	3209	大原山王1号橋	大原山王線	その他	2001	2.20	9.00	8.02	17.64	4,400	1	BOX	開水路	有り	20.26	2018年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2020年	1,045	2023年
421	3210	山王16号1号橋	山王16号線	その他	2005	5.35	4.80	4.00	21.40	4,400	1	BOX	開水路	有り	19.65	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	895	2023年
422	4001	伊月橋	池田宮ノ本線	その他	1988	32.95	6.00	5.00	164.75	5,300	2	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年
423	4002	東池田橋	池田御幸ノ北線	その他	1979	14.25	5.00	4.00	57.00	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
424	4003	東宮ノ本橋	宮ノ本1号線	その他	1975	22.75	4.70	4.00	91.00	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2042年	10,820	2025年
425	4004	池田橋	池田宮ノ本線	その他	1969	22.70	5.00	4.00	90.80	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2020年	1,095	2025年
426	4005	六反田橋	六反田中央線	2級	1970	24.00	4.30	3.50	84.00	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2020年	1,095	2025年
427	4006	六反田上橋	六反田西部線	その他	1981	26.65	4.50	3.50	93.28	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2048年	305	2025年
428	4007	秀清橋	秀清土成線	その他	1972	15.60	3.60	3.00	46.80	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	塗替塗装工	2041年	5,232	2025年
429	4008	御幸2号橋	宮ノ西南北線	その他	1986	19.70	5.20	4.50	88.65	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2044年	5,286	2025年
430	4009	御幸橋	宮ノ西1号線	その他	1975	25.05	3.70	3.00	75.15	4,400	2	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
431	4010	潺東下橋	大桑ノ北潺線	その他	1999	21.40	6.20	5.00	107.00	5,300	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年
432	4011	潺東1号橋	定松潺線	その他	1975	15.00	3.60	3.00	45.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	2,190	2025年
433	4012	潺東2号橋	定松潺線	その他	1975	17.60	3.60	3.00	52.80	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2033年	2,135	2025年
434	4013	北古田橋	市場東部線	その他	1979	14.40	6.70	6.00	86.40	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	塗替塗装工ほか	2048年	12,458	2025年
435	4014	金清橋	金清線	2級	1977	51.10	6.00	5.00	255.50	5,900	3	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	塗替塗装工ほか	2032年	22,076	2025年
436	4015	金清池橋	山麓東西1号線	その他	1976	24.00	7.50	6.50	156.00	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	塗替塗装工	2020年	12,179	2025年
437	4016	奈良坂橋	町筋奈良坂線	その他	1998	15.45	5.20	4.00	61.80	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
438	4017	稲荷橋	大門野田原線	1級	1982	63.00	6.20	5.00	315.00	5,900	3	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年
439	4018	大北通学橋	大北野田原線	その他	1997	35.50	5.20	4.00	142.00	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
440	4019	中筋通学橋	南淵野田原線	その他	1977	27.30	3.50	3.00	81.90	4,400	2	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	237	2025年
441	4020	大北落合橋	大北落合線	1級	1971	27.00	4.80	4.00	108.00	5,300	2	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	---	---	0	2025年
442	4021	為後橋	為後線	2級	1972	19.00	4.70	4.00	76.00	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	塗替塗装工	2024年	6,834	2025年
443	4022	川北橋	川北線	その他	1962	24.00	3.70	3.00	72.00	4,400	2	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
444	4023	大池橋	岩野2号線	その他	1977	18.20	4.60	4.00	72.80	4,400	2	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2038年	3,230	2025年
445	4024	久牛橋	久牛線	その他	1980	20.40	3.70	3.00	61.20	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	塗替塗装工	2033年	7,016	2025年
446	4025	遅越下橋	遅越線	2級	1962	26.50	3.40	3.00	79.50	4,400	4	RC橋	河川	有り	99	2020年	III	管理区分2	断面修復工ほか	2023年	4,418	2025年
447	4026	竹倉橋	竹倉遅越線	その他	1977	14.80	2.50	2.00	29.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
448	4027	遅越橋	遅越線	2級	1978	29.17	5.30	4.50	131.27	5,300	2	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	塗替塗装工ほか	2047年	29,505	2025年
449	4028	大影橋(相栗川原芝2号線)	相栗川原芝2号線	その他	1981	25.60	4.00	3.00	76.80	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
450	4029	太田橋	太田線	その他	1978	14.70	5.00	4.00	58.80	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	169	2026年

事業計画一覧(10/13)

整理番号	橋梁コード	橋梁名	路線名称	道路種別	架設年度	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	橋面積(m ²)	委託費(千円)	径間数	橋種	考慮すべき事項			点検年度	健全性の診断	管理区分	修繕対策			点検実施時期
													路下条件	迂回路の有無	海岸からの距離(km)				対策内容	実施時期	概算事業費(千円)	
451	4030	ニイヤ橋	ニイヤ線	その他	1980	17.40	3.70	3.00	52.20	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
452	4031	国行橋	国行線	その他	1975	15.06	3.60	3.00	45.18	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	122	2025年
453	4032	善入寺島橋	善入寺島中央東西線	その他	1979	52.15	4.00	3.50	182.53	5,300	5	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
454	4034	八坂金清跨道橋	高西2号線	その他	1993	43.94	5.70	4.00	175.76	5,300	3	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2038年	29,944	2025年
455	4035	八坂第1跨道橋	春日神社線	その他	1993	33.24	5.00	4.00	132.96	5,300	2	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2020年	8,372	2025年
456	4036	八坂第2跨道橋	北洲南北2号線	その他	1993	36.57	4.00	3.00	109.71	5,300	2	PC橋	道路	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2026年	4,535	2025年
457	4037	大影橋(境目ニイヤ線)	境目ニイヤ線	その他	1962	20.10	6.50	6.00	120.60	5,300	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	---	---	0	2025年
458	4038	新北洲橋	山麓東西1号線	その他	1976	13.60	7.70	7.00	95.20	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2044年	18,554	2025年
459	4039	御幸ノ北橋	御幸ノ北線	その他	2001	13.70	6.20	5.00	68.50	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2025年	5,173	2025年
460	4040	大月橋	相栗小月線	その他	1936	11.80	5.10	4.50	53.10	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	III	管理区分3	断面修復工ほか	2033年	2,185	2025年
461	4041	新猪ノ谷橋	猪谷橋線	その他	1989	13.50	5.20	4.00	54.00	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
462	4042	鶯谷川1号橋	郷社前南北線	その他	1996	11.60	5.20	4.00	46.40	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
463	4043	北洲橋	日吉東西線	その他	1994	10.50	5.30	4.50	47.25	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
464	4044	境目橋	太田2号線	その他	1996	13.60	4.80	4.00	54.40	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
465	4045	相栗橋	相栗2号線	その他	1979	10.00	4.80	4.00	40.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	1,701	2026年
466	4046	美濃谷橋	蛭子平地線	その他	1993	10.60	4.80	4.00	42.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
467	4047	高西谷橋	八坂線	その他	1993	13.50	5.20	4.00	54.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
468	4048	柿ノ木谷橋	柿ノ木谷線	その他	1993	12.50	6.20	5.00	62.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2029年	4,939	2025年
469	4049	中池田橋	九頭宇谷左岸堤天線	その他	1973	14.80	3.00	2.00	29.60	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
470	4050	秀清2号橋	宮ノ本六反田線	その他	1976	9.00	5.00	3.00	27.00	4,400	1	PC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
471	4051	町境橋	池田御幸ノ北線	その他	1982	10.35	5.62	4.62	47.82	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2036年	1,976	2025年
472	4052	指谷橋(池田御幸ノ北線)	池田御幸ノ北線	その他	1974	13.69	3.60	3.00	41.07	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	III	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	2,239	2025年
473	4053	潺北2号橋	宮ノ西定松線	その他	1981	9.20	6.20	5.65	51.98	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2025年	3,151	2025年
474	4054	潺北1号橋	定松南北2号線	その他	1976	12.08	4.00	3.00	36.24	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
475	4055	定松南橋	宮ノ西定松線	その他	1984	7.50	3.60	3.00	22.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
476	4056	北御所ノ原橋	定松御所ノ原線	その他	1984	5.10	6.80	6.20	31.62	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2025年	1,870	2026年
477	4057	潺中橋	潺南北2号線	その他	1978	3.84	4.40	4.00	15.36	4,400	1	RC橋	河川	有り	17.16	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
478	4058	潺南橋	潺南北2号線	その他	1977	4.28	4.70	4.20	17.98	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
479	4059	南御所ノ原橋	定松御所ノ原線	その他	1975	5.60	4.70	4.10	22.96	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2041年	925	2022年
480	4060	八幡東橋	定松御所ノ原線	その他	1990	9.35	4.35	3.55	33.19	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
481	4061	八幡西橋	町屋敷土成線	その他	1975	5.08	3.00	2.60	13.21	4,400	1	RC橋	河川	有り	16.93	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	753	2023年
482	4062	東島橋	江ノ島南北線	その他	1986	2.15	4.35	4.00	8.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	17.62	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
483	4063	南天神橋	杉ノ前江ノ島線	その他	1974	3.65	4.30	4.00	14.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	17.81	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
484	4064	東王子前橋	江ノ島南北2号線	その他	1976	3.20	4.60	4.00	12.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	17.91	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	655	2023年
485	4065	東江ノ島2号橋	天神江ノ島2号線	その他	1978	2.14	3.80	3.40	7.28	4,400	1	RC橋	河川	有り	17.51	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2040年	274	2023年
486	4066	東江ノ島1号橋	天神江ノ島線	その他	1978	2.54	3.50	3.00	7.62	4,400	1	RC橋	河川	有り	17.53	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2041年	299	2023年
487	4067	杉ノ前中央橋	杉ノ前江ノ島線	その他	1973	2.10	5.65	5.40	11.34	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分2	---	---	0	2022年
488	4068	東天神2号橋	天神線	その他	1978	4.90	4.30	4.00	19.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
489	4069	東天神1号橋	東天神線	その他	1978	4.70	5.80	5.00	23.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2023年	1,434	2026年
490	4070	北天神橋	町屋敷天神線	その他	1971	6.00	6.65	6.30	37.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2024年	2,163	2026年
491	4071	小磯橋	小磯立石線	その他	1976	4.70	5.00	4.25	19.98	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	465	2022年
492	4072	新の池橋	末広線	その他	1963	5.50	3.25	2.95	16.23	4,400	1	RC橋	河川	有り	17.19	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	609	2023年
493	4073	野神橋	八幡農協線	その他	1976	6.96	5.40	5.00	34.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
494	4075	白坂橋	中山白坂2号線	その他	1981	6.91	3.50	3.00	20.73	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
495	4076	御墓橋	中山白坂線	その他	1981	7.07	4.00	3.50	24.75	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	1,077	2022年
496	4077	大西橋	大西南北3号線	その他	1981	3.90	3.75	3.75	14.63	4,400	1	RC橋	河川	有り	17.81	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
497	4078	末広橋	末広東西線	その他	1973	11.00	4.00	3.60	39.60	4,400	2	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	800	2026年
498	4079	池ノ本橋	池ノ本東原線	その他	1983	6.50	4.80	4.20	27.30	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
499	4080	吉友2号橋	吉友土成2号線	その他	1975	5.14	4.25	3.80	19.53	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
500	4081	吉友1号橋	東原土成線	その他	1975	5.50	4.80	4.00	22.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年

事業計画一覧(11/13)

整理番号	橋梁コード	橋梁名	路線名称	道路種別	架設年度	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	橋面積(m ²)	委託費(千円)	径間数	橋種	考慮すべき事項			点検年度	健全性の診断	管理区分	修繕対策			点検実施時期
													路下条件	迂回路の有無	海岸からの距離(km)				対策内容	実施時期	概算事業費(千円)	
501	4082	中東原橋	東原東西2号線	その他	1976	3.60	3.00	2.60	9.36	4,400	1	RC橋	河川	有り	16.61	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
502	4083	南田橋	池ノ本東西2号線	その他	2001	7.40	5.40	4.50	33.30	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	1,183	2022年
503	4084	神ノ木3号橋	神ノ木東西2号線	その他	1993	4.90	5.70	4.90	24.01	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2044年	859	2022年
504	4085	東上神ノ木橋	神ノ木東西線	その他	1976	4.80	3.85	3.40	16.32	4,400	1	RC橋	河川	有り	16.88	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
505	4086	観音谷橋	神ノ木線	その他	1976	4.40	3.40	3.00	13.20	4,400	1	RC橋	河川	有り	16.8	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	744	2023年
506	4087	西神ノ木橋	南田池ノ本線	その他	1974	7.25	5.30	4.50	32.63	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	1,649	2022年
507	4088	神ノ木中橋	古田池ノ本線	その他	1975	5.00	3.00	3.00	15.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	16.99	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
508	4089	神ノ木第2号橋	池ノ本東西線	その他	1983	8.20	4.60	3.90	31.98	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
509	4090	上神ノ木橋	古田池ノ本線	その他	1976	6.10	3.50	3.10	18.91	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
510	4093	奥古田橋	古田金清線	その他	1982	10.00	4.70	4.10	41.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
511	4095	源太池橋	池ノ本末広線	その他	1977	8.07	4.55	4.05	32.68	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	1,152	2022年
512	4096	姥谷橋	興崎末広線	その他	1990	2.60	5.45	5.30	13.78	4,400	1	BOX	河川	有り	17.77	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	482	2023年
513	4097	西ノ岡中央橋	郷社本東西3号線	その他	1966	2.21	10.60	10.40	22.98	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
514	4098	住吉橋	香美東西3号線	1級	1987	3.55	4.45	4.25	15.09	4,400	1	RC橋	開水路	有り	19.16	2018年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2034年	2,775	2023年
515	4099	香美2号橋	原田東西線	その他	1943	2.53	3.00	2.60	6.58	4,400	1	RC橋	開水路	有り	19.04	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
516	4100	渡り2号橋	渡り南北4号線	その他	1985	4.00	4.30	4.00	16.00	4,400	1	RC橋	開水路	有り	20.08	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
517	4101	渡り1号橋	渡り南北3号線	その他	1983	5.10	4.20	3.50	17.85	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
518	4103	用水1号橋	興崎南北線	その他	1974	4.18	25.50	24.70	103.25	5,300	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2023年	5,918	2026年
519	4104	用水2号橋	日吉興崎線	その他	1980	3.40	16.40	15.60	53.04	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2024年	2,911	2026年
520	4105	用水3号橋	金清線	2級	1985	6.40	6.20	5.00	32.00	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
521	4106	用水4号橋	上野段南北2号線	その他	1953	2.40	3.50	3.50	8.40	4,400	1	BOX	開水路	有り	18.19	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	301	2023年
522	4107	用水5号橋	上野段南北線	その他	1980	2.40	8.40	8.40	20.16	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2040年	553	2022年
523	4108	尾開橋	八坂日吉線	その他	1956	10.00	2.70	2.50	25.00	4,400	2	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	塗替塗装工	2042年	92	2025年
524	4109	成功橋	北淵線	その他	1957	7.45	4.40	4.00	29.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
525	4110	金清谷橋	金清2号線	その他	1975	7.10	4.30	4.00	28.40	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
526	4111	本村3号橋	貞久土井線	その他	1982	7.20	3.80	3.00	21.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
527	4112	本村2号橋	貞久土井線	その他	1979	3.20	3.60	3.40	10.88	4,400	1	RC橋	開水路	有り	19.48	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
528	4113	本村1号橋	本村中央線	その他	1993	7.50	5.20	4.00	30.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
529	4114	貞久橋	本村中央線	その他	1991	4.75	4.60	4.00	19.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
530	4115	切池橋	鍛冶屋原敷線	その他	1994	5.85	19.09	8.94	52.30	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2035年	20,949	2026年
531	4116	原淵橋	法寺東線	その他	1955	3.65	2.65	2.35	8.58	4,400	1	RC橋	河川	有り	18.7	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
532	4117	本村橋	遠光東西2号線	その他	1963	4.70	3.40	3.00	14.10	4,400	1	RC橋	河川	有り	18.8	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
533	4118	法寺谷橋	二俣法寺線	その他	1955	5.84	4.10	3.90	22.78	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2020年	1,365	2022年
534	4120	法寺橋	二俣法寺線	2級	1955	3.65	4.20	3.60	13.14	4,400	1	RC橋	河川	有り	18.53	2018年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2036年	407	2023年
535	4121	別埜谷下橋	宇佐東西線	その他	2002	3.80	4.45	4.05	15.39	4,400	1	RC橋	河川	有り	18.36	2018年	I	管理区分3	---	---	0	2023年
536	4122	別埜谷橋	遠光線	その他	1990	5.30	4.80	4.00	21.20	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
537	4123	別埜谷上橋	山麓東西2号線	その他	1975	6.00	7.80	7.00	42.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2029年	2,543	2026年
538	4124	坪井谷橋	坪井谷線	その他	1967	5.00	3.50	3.20	16.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	18.5	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
539	4125	遠光橋	遠光東西線	その他	1957	4.20	4.80	4.80	20.16	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
540	4126	坪井谷下橋	二俣法寺線	その他	2002	4.20	5.80	5.00	21.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2021年	1,301	2026年
541	4127	坪井谷中橋	山麓東西2号線	その他	1975	6.70	7.10	6.70	44.89	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分1	---	---	0	2026年
542	4128	坪井谷上橋	上喜来大俣山手線	その他	1970	3.80	4.20	3.60	13.68	4,400	1	RC橋	河川	有り	18.24	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
543	4129	小池橋	大門本村線	1級	1976	9.35	5.80	5.00	46.75	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	---	---	0	2025年
544	4130	大開1号橋	大門本村線	1級	1976	3.50	6.25	5.50	19.25	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
545	4131	大開2号橋	大開上池線	その他	1995	2.75	7.80	6.60	18.15	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2025年	1,094	2026年
546	4132	鯨橋	大門本村線	1級	1976	7.50	15.60	14.90	111.75	5,300	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	---	---	0	2025年
547	4134	円西橋	二俣東西線	その他	1976	4.00	12.45	12.05	48.20	4,400	1	RC橋	開水路	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
548	4143	僧都谷橋	大門野田原線	1級	1975	7.40	11.34	10.54	78.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2039年	15,537	2025年
549	4144	稻荷中橋	大門野田原線	1級	1975	5.40	4.60	4.00	21.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分2	---	---	0	2022年
550	4145	馬木谷橋	大門野田原線	1級	1973	7.00	8.00	7.20	50.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	---	---	0	2025年

事業計画一覧(12/13)

整理番号	橋梁コード	橋梁名	路線名称	道路種別	架設年度	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	橋面積(m ²)	委託費(千円)	径間数	橋種	考慮すべき事項			点検年度	健全性の診断	管理区分	修繕対策			点検実施時期
													路下条件	迂回路の有無	海岸からの距離(km)				対策内容	実施時期	概算事業費(千円)	
551	4146	野田原橋	大門野田原線	1級	1985	3.18	5.50	5.10	16.22	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
552	4147	猪谷橋	川又川北線	その他	1962	6.55	5.30	5.00	32.75	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2024年	1,924	2026年
553	4148	根来橋	根来線	その他	1975	13.00	3.70	3.00	39.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
554	4149	花子上橋	東仁賀木線	その他	1976	7.50	2.70	2.30	17.25	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
555	4150	花子下橋	東仁賀木線	その他	1976	4.20	3.00	3.00	12.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	10.82	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
556	4151	上仁賀木橋	仁賀木線	その他	1966	5.50	4.80	4.00	22.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
557	4152	上仁賀木2号橋	仁賀木線	その他	1967	6.50	4.80	4.00	26.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
558	4153	上仁賀木4号橋	仁賀木線	その他	1967	5.45	4.80	4.00	21.80	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
559	4154	上仁賀木5号橋	仁賀木線	その他	1967	4.40	5.20	4.40	19.36	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	754	2023年
560	4155	上大池橋	岩野2号線	その他	1976	4.27	4.36	4.06	17.34	4,400	1	鋼橋	河川	有り	14.6	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
561	4156	両国橋	境目線	その他	1989	9.20	6.20	5.00	46.00	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分2	---	---	0	2025年
562	4157	川原芝中橋	川原芝線	その他	1987	7.50	4.80	4.00	30.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
563	4158	国行上橋	国行線	その他	1970	5.42	2.80	2.50	13.55	4,400	1	RC橋	河川	有り	11.8	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
564	4159	南谷橋	番所線	その他	1955	7.20	3.90	3.90	28.08	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
565	4160	番所橋	番所線	その他	1955	2.65	3.80	3.00	7.95	4,400	1	RC橋	河川	有り	12.42	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	314	2023年
566	4161	ニイヤ下橋	ニイヤ線	その他	1981	3.30	5.40	5.00	16.50	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
567	4162	遅越中橋	遅越線	2級	1977	3.25	4.70	4.40	14.30	4,400	1	RC橋	河川	有り	13.4	2018年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2023年	759	2023年
568	4163	大月上橋	大月2号線	その他	1955	4.80	4.90	4.90	23.52	4,400	1	その他	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	塗替塗装工	2033年	1,119	2022年
569	4165	長谷橋	長谷線	その他	1960	7.20	3.95	3.55	25.56	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
570	4166	原淵2号橋	法寺東線	その他	1984	5.30	4.60	4.00	21.20	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
571	4167	小竹橋	小竹線	その他	1980	6.20	3.40	3.00	18.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	III	管理区分3	---	---	0	2022年
572	4168	北淵中橋	北淵線	その他	1989	2.85	5.30	4.70	13.40	4,400	1	BOX	河川	有り	17	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	705	2023年
573	4170	金清谷3号橋	金清4号線	その他	1961	6.50	3.40	3.40	22.10	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
574	4171	西ノ岡1号橋	郷社本東西5号線	その他	1982	2.30	4.40	4.00	9.20	4,400	1	RC橋	河川	有り	18.44	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
575	4172	西ノ岡2号橋	郷社本東西4号線	その他	1995	3.00	4.80	4.00	12.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	19.15	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
576	4173	郷社前1号橋	香美白坂天神線	その他	1979	2.32	16.11	12.11	28.10	4,400	1	BOX	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
577	4174	郷社前2号橋	郷社前南北2号線	その他	1981	2.50	3.16	2.96	7.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	19.15	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
578	4175	杉ノ前上橋	杉ノ前東西2号線	その他	1981	2.30	3.90	3.50	8.05	4,400	1	RC橋	河川	有り	17.55	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
579	4176	潺南1号橋	潺東西線	その他	1993	4.30	6.90	6.50	27.95	4,400	1	RC橋	開水路	有り	17.17	2018年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2040年	5,124	2023年
580	4177	潺南2号橋	潺南北線	その他	1982	5.90	3.60	3.00	17.70	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
581	4178	定松中橋	定松南北2号線	その他	1991	4.20	4.76	4.76	19.99	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
582	4179	御幸ノ北1号橋	御幸ノ北宮ノ本線	その他	1982	10.50	4.70	4.00	42.00	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2049年	2,289	2025年
583	4180	大西2号橋	大西王子前線	その他	1970	2.90	3.00	3.00	8.70	4,400	1	BOX	河川	有り	18.49	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	316	2023年
584	4181	白坂上橋	白坂南北線	その他	1982	2.71	6.89	6.89	18.67	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
585	4182	南御所ノ原2号橋	御所ノ原東西3号線	その他	1980	5.48	2.00	2.00	10.96	4,400	1	RC橋	河川	有り	17.3	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
586	4183	久光2号橋	久光東西線	その他	2001	2.10	4.50	4.00	8.40	4,400	1	BOX	開水路	有り	19.57	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
587	4184	久光1号橋	新女寺2号線	その他	1954	2.00	13.75	13.35	26.70	4,400	1	BOX	開水路	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	1,110	2022年
588	4185	池谷橋	善入寺東西2号線	その他	1983	3.80	4.80	4.00	15.20	4,400	1	RC橋	開水路	有り	18.96	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
589	4186	定松南2号橋	宮ノ西定松線	その他	1984	8.10	4.60	4.00	32.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
590	4187	渡り3号橋	不明(市道と接していない)	その他	1990	4.80	3.00	2.60	12.48	4,400	1	PC橋	河川	有り	22.1	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	484	2023年
591	4188	大野島住宅橋	大野島住宅線	その他	1984	2.40	9.75	9.43	22.63	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
592	4189	西ノ岡3号橋	郷社本東西6号線	その他	1985	3.00	6.04	5.64	16.92	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
593	4190	岩野7号橋	岩野7号線	その他	1986	4.50	4.60	4.00	18.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2041年	657	2022年
594	4191	郷社本1号橋	郷社本南北7号線	その他	1988	3.80	4.50	4.00	15.20	4,400	1	RC橋	開水路	有り	18.27	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2039年	889	2023年
595	4192	善入寺1号橋	原田善入寺2号線	その他	1988	3.22	5.95	5.15	16.58	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	---	---	0	2026年
596	4193	敷地原淵1号橋	敷地原淵線	その他	1990	4.80	3.40	3.00	14.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	19.08	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
597	4194	敷地原淵2号橋	敷地原淵線	その他	1990	4.80	3.40	3.00	14.40	4,400	1	RC橋	開水路	有り	18.69	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
598	4195	敷地原淵3号橋	敷地原淵線	その他	1990	4.50	4.20	3.50	15.75	4,400	1	RC橋	河川	有り	18.4	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
599	4196	定松中2号橋	定松南北2号線	その他	1990	4.85	4.80	4.00	19.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
600	4197	中佐古橋	中佐古線	その他	1992	2.05	8.00	7.00	14.35	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2028年	809	2022年

事業計画一覧(13/13)

整理番号	橋梁コード	橋梁名	路線名称	道路種別	架設年度	橋長(m)	全幅員(m)	有効幅員(m)	橋面積(m ²)	委託費(千円)	径間数	橋種	考慮すべき事項			点検年度	健全性の診断	管理区分	修繕対策			点検実施時期
													路下条件	迂回路の有無	海岸からの距離(km)				対策内容	実施時期	概算事業費(千円)	
601	4198	興崎南橋	興崎南北9号線	その他	1990	3.10	7.68	6.88	21.33	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2031年	1,251	2026年
602	4199	江ノ島南橋	江ノ島線	その他	1990	5.00	4.30	4.00	20.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
603	4200	中佐古橋2号橋	開ノ口円定線	その他	1993	2.05	8.00	7.00	14.35	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分1	断面修復工ほか	2020年	832	2022年
604	4201	飯谷橋	飯谷線	その他	1993	8.00	4.80	4.00	32.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
605	4202	北淵2号橋	日吉南北4号線	その他	1964	7.13	3.40	3.00	21.39	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
606	4203	定松橋	定松東西線	その他	1990	5.50	4.80	4.00	22.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
607	4204	瀧南3号橋	御所ノ原線	その他	1995	3.10	11.20	10.60	32.86	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2025年	1,855	2026年
608	4205	金清谷4号橋	飯谷南北線	その他	1979	7.20	3.30	3.00	21.60	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
609	4206	仁賀木小橋	奥日開谷南北線	その他	1970	5.00	3.40	3.00	15.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	11.57	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2035年	115	2023年
610	4207	上土井池橋	清原東西2号線	その他	1989	8.00	5.20	4.00	32.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2031年	176	2022年
611	4208	稲荷東橋	定松岸ノ下線	その他	1965	3.50	4.80	4.40	15.40	4,400	1	RC橋	河川	有り	16.93	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
612	4209	八幡橋	定松岸ノ下線	その他	1990	5.20	5.30	4.90	25.48	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
613	4210	中山橋	定松岸ノ下線	その他	1990	7.40	6.20	5.00	37.00	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2044年	9,317	2026年
614	4211	大西東橋	定松岸ノ下線	その他	1965	2.30	6.75	6.75	15.53	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分2	---	---	0	2022年
615	4212	南田2号橋	池ノ本東西2号線	その他	2001	7.90	5.40	4.50	35.55	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
616	4213	法寺2号橋	山路東西2号線	その他	2001	5.45	6.78	5.58	30.41	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2034年	6,604	2026年
617	4214	渡り4号橋	渡り南北5号線	その他	1990	2.10	4.50	4.00	8.40	4,400	1	RC橋	開水路	有り	20.35	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
618	4215	用水9号橋	興崎南北2号線	その他	1990	2.60	5.75	5.30	13.78	4,400	1	RC橋	開水路	有り	17.94	2018年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2025年	809	2023年
619	4216	奥日開谷橋	奥日開谷原田線	その他	1975	12.00	2.50	2.10	25.20	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	塗替塗装工	2041年	8,747	2026年
620	4217	川原芝2号橋	川原芝2号線	その他	1991	7.00	3.00	2.75	19.25	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
621	4218	国行3号橋	国行3号線	その他	1965	6.10	3.50	3.24	19.76	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2026年	753	2022年
622	4219	国行5号橋	国行5号線	その他	1975	11.10	3.60	3.00	33.30	4,400	1	鋼橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	塗替塗装工、断面修復工ほか	2033年	3,665	2025年
623	4220	北原橋(北原開ノ口線)	北原開ノ口線	2級	1987	2.00	5.05	4.45	8.90	4,400	1	RC橋	開水路	有り	17.3	2018年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2020年	527	2023年
624	4221	大俣7号橋	貞久土井線	その他	1990	16.40	5.20	4.00	65.60	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2020年	II	管理区分3	---	---	0	2025年
625	4222	大俣8号橋	八幡東西5号線	その他	1990	10.90	5.20	4.00	43.60	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
626	4223	大俣9号橋	八幡土井線	その他	1989	9.20	5.20	4.00	36.80	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
627	4224	大俣10号橋	八幡清原線	その他	1990	9.20	5.20	4.00	36.80	4,400	1	PC橋	河川	有り	99	2017年	II	管理区分3	---	---	0	2022年
628	4225	川原芝3号橋	不明(市道と接していない)	その他	1975	10.10	3.80	3.00	30.30	4,400	1	RC橋	河川	有り	99	2021年	II	管理区分3	---	---	0	2026年
629	4226	立石橋(立石線)	立石線	その他	1990	5.50	7.50	4.90	26.95	4,400	1	BOX	河川	有り	17.17	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2042年	1,421	2023年
630	4227	第1秀清橋	宮ノ本六反田線	その他	1990	9.20	4.05	3.05	28.06	4,400	1	PC橋	河川	有り	16.3	2018年	II	管理区分3	---	---	0	2023年
631	4228	第3秀清橋	宮ノ本六反田線	その他	1990	10.80	5.05	4.05	43.74	4,400	1	PC橋	河川	有り	16.2	2018年	II	管理区分3	断面修復工ほか	2043年	1,939	2023年
632	4229	第4秀清橋	宮ノ本六反田線	その他	1990	10.50	6.10	5.20	54.60	4,400	1	PC橋	河川	有り	16.12	2018年	II	管理区分2	断面修復工ほか	2039年	19,641	2023年



あわし

検索

